

ITABAIANA GOVERNO MUNICIPAL				ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 01				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 27.590,45			
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço: OS 0002/2022		29/04/2022									
Medição: BM 01 - ESCOLA MIGUEL ÂNGELO DA SILVA DANTAS				Tomada de Preço: TP 00001/2022											
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ ANTÔNIO AGUIAR, MIGUEL ÂNGELO DA SILVA DANTAS, JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO.								Prazo da Obra:		150 dias					
								Prazo decorrido:		85 dias					
Serviços Medidos: Serv. Preliminares/Demolições; Instalações Elétricas; Instalações Hidrossanitárias; Forro de Gesso; Pavimentação; Esquadrias; Elevação, Revestimento e Pintura.								Valor do contrato:		R\$160.997,77					
								Valor Acumulado das Medições:		R\$0,00					
Firma: RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				Período: 02/05/2022		26/07/2022		Saldo do Contrato:		R\$160.997,77					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO			
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$1.796,15			
1.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	317,87	4,50	0,00	4,50	4,50	-	1.430,42	1.430,42	1.430,42	R\$ -			
1.1.2	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	5,98	30,80	0,00	30,80	30,80	-	184,18	184,18	184,18	R\$ -			
1.1.3	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIØM 1/2" A 1"	m	4,63	30,80	0,00	30,80	30,80	-	142,60	142,60	142,60	R\$ -			
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (OOBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO	m³	24,66	1,58	0,00	1,58	1,58	-	38,96	38,96	38,96	R\$ -			
									1.796,15	1.796,15	1.796,15				
1.2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES											R\$5.369,42			
1.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	und	489,47	1,00	0,00	1,00	1,00	-	489,47	489,47	489,47	R\$ -			
1.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	und	7,13	1,00	0,00	1,00	1,00	-	7,13	7,13	7,13	R\$ -			
1.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUOCAO SKA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	und	17,24	4,00	0,00	4,00	4,00	-	68,96	68,96	68,96	R\$ -			
1.2.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	und	60,56	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	121,12	0,00	0,00	R\$ 121,12			
1.2.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE LED 25W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	67,35	3,00	0,00	3,00	3,00	-	202,05	202,05	202,05	R\$ -			
1.2.6	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	20,54	22,00	0,00	22,00	22,00	-	451,88	451,88	451,88	R\$ -			
1.2.7	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	40,71	9,00	0,00	9,00	9,00	-	366,39	366,39	366,39	R\$ -			
1.2.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM 1 LAMPADA DE LED 50W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	75,91	14,00	0,00	14,00	14,00	-	1.062,74	1.062,74	1.062,74	R\$ -			
1.2.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und	29,72	4,00	0,00	4,00	4,00	-	118,88	118,88	118,88	R\$ -			
1.2.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und	19,43	7,00	0,00	7,00	7,00	-	136,01	136,01	136,01	R\$ -			
1.2.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	4,41	88,30	0,00	88,30	88,30	-	389,40	389,40	389,40	R\$ -			
1.2.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	6,12	16,60	0,00	16,60	16,60	-	101,59	101,59	101,59	R\$ -			
1.2.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	4,83	19,60	0,00	19,60	19,60	-	94,66	94,66	94,66	R\$ -			
1.2.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3,59	341,90	0,00	341,90	341,90	-	1.227,42	1.227,42	1.227,42	R\$ -			
1.2.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und	9,97	20,00	0,00	20,00	20,00	-	199,40	199,40	199,40	R\$ -			

1.2.16	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und	7,01	19,00	0,00	19,00	19,00	-	133,19	133,19	133,19	R\$ -
1.2.17	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	und	7,93	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	23,79	0,00	0,00	R\$ 23,79
1.2.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und	32,53	2,00	0,00	2,00	2,00	-	65,06	65,06	65,06	R\$ -
1.2.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und	18,38	6,00	0,00	6,00	6,00	-	110,28	110,28	110,28	R\$ -
									5.369,42	5.224,51	5.224,51	
1.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											R\$1.436,78
1.3.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	und	99,31	2,00	0,00	2,00	2,00	-	198,62	198,62	198,62	R\$ -
1.3.2	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und	99,11	2,00	0,00	2,00	2,00	-	198,22	198,22	198,22	R\$ -
1.3.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und	188,24	4,00	0,00	4,00	4,00	-	752,96	752,96	752,96	R\$ -
1.3.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	und	58,08	2,00	0,00	2,00	2,00	-	116,16	116,16	116,16	R\$ -
1.3.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und	85,41	2,00	0,00	2,00	2,00	-	170,82	170,82	170,82	R\$ -
									1.436,78	1.436,78	1.436,78	
1.4	FORRO DE GESSO											R\$5.784,31
1.4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017_P	m²	29,89	193,52	0,00	193,52	193,52	-	5.784,31	5.784,31	5.784,31	R\$ -
									5.784,31	5.784,31	5.784,31	
1.5	PAVIMENTAÇÃO											R\$3.114,11
1.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	m²	37,18	57,06	0,00	57,06	57,06	-	2.121,49	2.121,49	2.121,49	R\$ -
1.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	81,63	12,16	0,00	12,16	12,16	-	992,62	992,62	992,62	R\$ -
									3.114,11	3.114,11	3.114,11	
1.6	ESQUADRIAS											R\$ 5.245,83
1.6.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	388,58	13,50	0,00	13,50	13,50	-	5.245,83	5.245,83	5.245,83	R\$ -
									5.245,83	5.245,83	5.245,83	
1.7	ELEVAÇÃO, REVESTIMENTO E PINTURA											R\$4.988,76
1.7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	64,98	10,50	0,00	10,50	10,50	-	682,29	682,29	682,29	R\$ -
1.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	19,12	3,08	0,00	3,08	3,08	-	58,88	58,88	58,88	R\$ -
1.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	9,32	455,75	0,00	455,75	455,75	-	4.247,59	4.247,59	4.247,59	R\$ -
									4.988,76	4.988,76	4.988,76	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 27.735,36	R\$ 27.590,45	R\$ 27.590,45	R\$ 144,91

Representante da Empresa Contratada
Resiliencia Construtores, Incorporações e Serviços LTDA-ME
CNPJ 20.547.072/0001-60
Lucca Nogueira Bapper Araújo
Diretor Administrativo
CPF 707.981-144-95

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 161955144-3

Lúcio Flávio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

QUANTITATIVOS

BM 01

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ ANTÔNIO AGUIAR, MIGUEL A
CONTRATADA:	RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
PERÍODO:	02/05/2022 a 26/07/2022

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA

Placa de obra	Área
	4,50 m²

TOTAL MEDIDO	4,50 m²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 m²
MEDIÇÃO ATUAL	4,50 m²
TOTAL ACUMULADO	4,50 m²

1.1.2 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"

NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	METROS
	30,80 M

TOTAL MEDIDO	30,80 M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 M
MEDIÇÃO ATUAL	30,80 M
TOTAL ACUMULADO	30,80 M

1.1.3 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"

NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	METROS
	30,80 M

TOTAL MEDIDO	30,80 M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 M
MEDIÇÃO ATUAL	30,80 M
TOTAL ACUMULADO	30,80 M

1.1.4 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento

NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	VOLUME
	1,58 m³

TOTAL MEDIDO	1,58 m³
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 m³
MEDIÇÃO ATUAL	1,58 m³
TOTAL ACUMULADO	1,58 m³

1.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -

QUADRO GERAL	UNIDADE
	1,00 UND

TOTAL MEDIDO	1,00 UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 UND
MEDIÇÃO ATUAL	1,00 UND
TOTAL ACUMULADO	1,00 UND

1.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

INSTALADO NO QUADRO GERAL	UNIDADE
	1,00 UND

TOTAL MEDIDO	1,00 UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 UND

MEDIÇÃO ATUAL	1,00	UND
TOTAL ACUMULADO	1,00	UND

1.2.3 Disjuntor termomagnético monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

	UNIDADE
INSTALADO NO QUADRO GERAL	4,00 UND

TOTAL MEDIDO	4,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	4,00	UND
TOTAL ACUMULADO	4,00	UND

1.2.5 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 25W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

	UNIDADE
SECRETARIA, DEPÓSITO E ROLL DE ENTRADA	3,00 UND

TOTAL MEDIDO	3,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	3,00	UND
TOTAL ACUMULADO	3,00	UND

1.2.6 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede

	PONTOS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	22,00 PT

TOTAL MEDIDO	22,00	UND
--------------	-------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	PT
MEDIÇÃO ATUAL	22,00	UND
TOTAL ACUMULADO	22,00	UND

1.2.7 Revisão de ponto de tomada de força tipo 1

	PONTOS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	9,00 PT

TOTAL MEDIDO	9,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	PT
MEDIÇÃO ATUAL	9,00	UND
TOTAL ACUMULADO	9,00	UND

1.2.8 Luminária tipo plafon, com 1 lâmpada de led 50W- Fornecimento e instalação

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	14,00 UND

TOTAL MEDIDO	14,00	UND
--------------	-------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	14,00	UND
TOTAL ACUMULADO	14,00	UND

1.2.9 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	4,00 UND

TOTAL MEDIDO	4,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	4,00	UND
TOTAL ACUMULADO	4,00	UND

1.2.10 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	7,00 UND

TOTAL MEDIDO	7,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	7,00	UND
TOTAL ACUMULADO	7,00	UND

1.2.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	88,30 M

TOTAL MEDIDO	88,30	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	88,30	M
TOTAL ACUMULADO	88,30	M

1.2.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	16,60 M

TOTAL MEDIDO	16,60	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	16,60	M
TOTAL ACUMULADO	16,60	M

1.2.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	19,60 M

TOTAL MEDIDO	19,60	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	19,60	M
TOTAL ACUMULADO	19,60	M

1.2.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	341,90 M

TOTAL MEDIDO	341,90	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	341,90	M
TOTAL ACUMULADO	341,90	M

1.2.15 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	20,00 UND

TOTAL MEDIDO	20,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	20,00	UND
TOTAL ACUMULADO	20,00	UND

1.2.16 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	19,00 UND

TOTAL MEDIDO	19,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	19,00	UND
TOTAL ACUMULADO	19,00	UND

1.2.18 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	2,00 UND

TOTAL MEDIDO	2,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	2,00	UND
TOTAL ACUMULADO	2,00	UND

1.2.19 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	6,00 UND

Residência Construções, Incorporações e Serviços Eireli-ME
 CNPJ 20.347.872/0001-60
 Lucca Nogueira Dapper Araújo
 Diretor Administrativo
 CPF 797.981.144-95

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA-PB Nº 1619551446

TOTAL MEDIDO	6,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	6,00	UND
TOTAL ACUMULADO	6,00	UND

1.3 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**1.3.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E**

	UNIDADE
BANHEIROS	2,00 UND

TOTAL MEDIDO	2,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	2,00	UND
TOTAL ACUMULADO	2,00	UND

1.3.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

	UNIDADE
BANHEIROS	2,00 UND

TOTAL MEDIDO	2,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	2,00	UND
TOTAL ACUMULADO	2,00	UND

1.3.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

	UNIDADE
BANHEIROS	4,00 UND

TOTAL MEDIDO	4,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	4,00	UND
TOTAL ACUMULADO	4,00	UND

1.3.4 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

	UNIDADE
BANHEIROS	2,00 UND

TOTAL MEDIDO	2,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	2,00	UND
TOTAL ACUMULADO	2,00	UND

1.3.5 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

	UNIDADE
BANHEIROS	2,00 UND

TOTAL MEDIDO	2,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	2,00	UND
TOTAL ACUMULADO	2,00	UND

1.4 FORRO DE GESSO**1.4.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P**

	ÁREA
TODAS OS AMBIENTES INTERNOS	193,52 m²

TOTAL MEDIDO	193,52	m²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m²
MEDIÇÃO ATUAL	193,52	m²
TOTAL ACUMULADO	193,52	m²

1.5 PAVIMENTAÇÃO**1.5.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.**

	ÁREA
SALAS DE AULA + BANHEIROS	57,06 m²

Residência Construções, Incorporações e Serviços Eireli-ME
 CNPJ 20.547.032/0001-60
 Lucca Nogueira Dapper Araújo
 Diretor Administrativo
 CPF 707.981-144-95

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA-PB Nº 1619551446

TOTAL MEDIDO	57,06	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	57,06	m ²
TOTAL ACUMULADO	57,06	m ²

1.5.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,

ÁREA	
ÁREA EXTERNA FRENTE DOS BANHEIROS	12,16 m ²

TOTAL MEDIDO	12,16	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	12,16	m ²
TOTAL ACUMULADO	12,16	m ²

1.6 ESQUADRIAS
1.6.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

ÁREA	
SALAS DE AULA	13,50 m ²

TOTAL MEDIDO	13,50	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	13,50	m ²
TOTAL ACUMULADO	13,50	m ²

1.7 ELEVÇÃO, REVESTIMENTO E PINTURA
1.7.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA

ÁREA	
SALAS DE AULA	10,50 m ²

TOTAL MEDIDO	10,50	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	10,50	m ²
TOTAL ACUMULADO	10,50	m ²

1.7.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017


ÁREA	
SALAS DE AULA	3,08 m ²

TOTAL MEDIDO	3,08	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	3,08	m ²
TOTAL ACUMULADO	3,08	m ²

1.7.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ÁREA	
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	455,75 m ²

TOTAL MEDIDO	455,75	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	455,75	m ²
TOTAL ACUMULADO	455,75	m ²


 Anália Cristina Gonçalves da Cunha
 Engenheira Civil
 CREA-PB nº 16195514-0



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

02/05/2022 a 26/07/2022

CONSTRUTORA: RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ ANTÔNIO AGUIAR, MIGUEL ÂNGELO DA SILVA DANTAS, JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO

TOMADA DE PEÇO: TP 00001/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 0002/2022

**REFORMA E AMPLIAÇÃO
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS**

**LUIZ ANTONIO AGUIAR,
MIGUEL ANGELO DA SILVA DANTAS
E JOSE PEDRO DE ARAUJO
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB**

#MAISTRABALHO

CONTRATO 00079/2022
 DATA INÍCIO: 09/05/2022
 PRAZO DO TÉRMINO: 150 DIAS
 VALOR R\$ 160.997,77
 EMPRESA CONTRATADA:
 RESILIENCIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
 CNPJ 20.547.072/0001-60

GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA
 #maistrabalho



FOTO 01 - PLACA DE OBRA

FOTO 02 - FACHADA



FOTO 03 - FACHADA

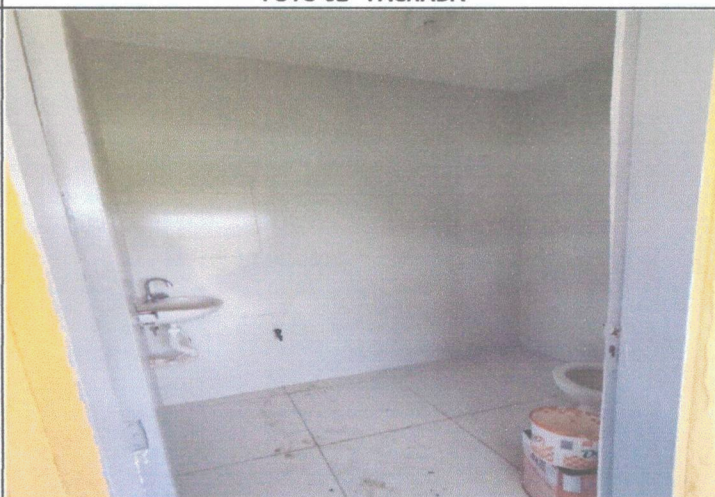


FOTO 04 - BANHEIRO



FOTO 05 - COZINHA

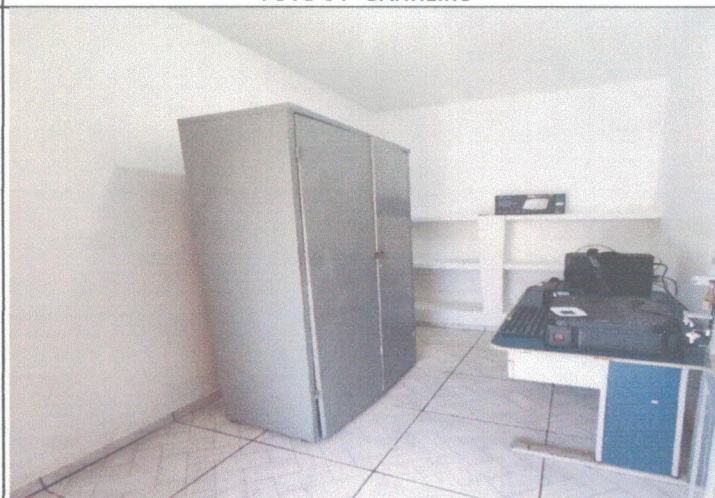


FOTO 06 - DIRETORIA



FOTO 07 - DISPENSA

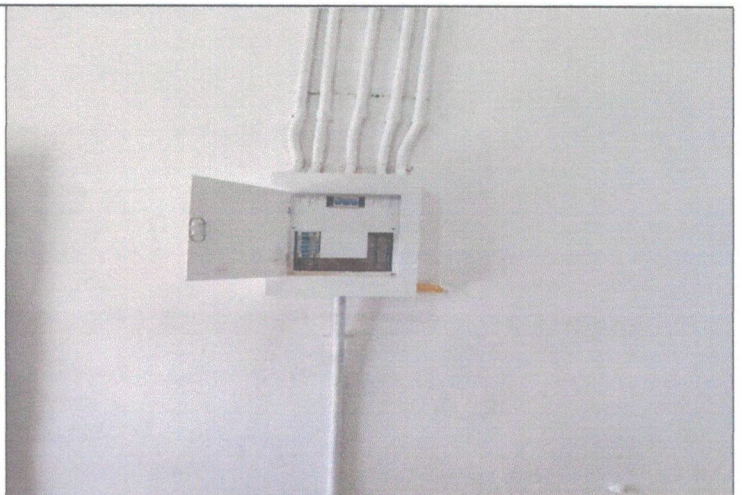


FOTO 08 - QUADRO DE DISJUNTOR



FOTO 09 - ÁREA EXTERNA



FOTO 10 - SALA 01



FOTO 11 - SALA 02



FOTO 12 - SALA 3

Resiliência Construções, Incorporações e Serviços Eireli-ME
CNPJ 20.547.072/0001-60
Lucca Nogueira Dapper Araújo
Diretor Administrativo
CPF 707.981-144-95



Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB N° 1619551446



FOTO 13 - ESQUADRIA DE MADEIRA



FOTO 14 - ESQUADRIA DE FERRO

Resiliência Construções, Incorporações e Serviços Eireli-ME
CNPJ 20.547.072/0001-60
Lucca Nogueira Dapper Araújo
Diretor Administrativo
CPF 707.981-144-95

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB N° 1619551446
