



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ: 09.072.430/0001-93

**OBRA – CRECHE MARLUCE
MARIA BORBA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

VALOR: R\$ 65.170,92

	EMPENHO
	LIQUIDAÇÃO
	NOTA FISCAL
	BOLETIM DE MEDIÇÃO
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
	MEMÓRIA DE CALCULO
	PAGAMENTO+ENCARGOS (INSS - ISS)
	CERTIDÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 09.072.430/0001-93

AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000

FONE: (8) -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial		Número: 0007266	Data de Emissão: 22/12/2022	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 220		Unidade Orçamentária: 0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
Classificação da Despesa: 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2002 - APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 1032 - CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO				Saldo Anterior: 65.216,91 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 65.216,91 Este Empenho: 65.170,92 Saldo da Dotação: 45,99	
Credor: FM CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES LTDA			Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.958.594/0001-64	
Endereço: RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE. 22			Complemento:		
Bairro: TORRE	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB		CEP: 58040-720		
Especificação da Despesa: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
Tipo de Meta: 4 - OBRAS		Convênio:		Valor da Despesa: 65.170,92	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação: 00016/2022		Modalidade: 11-Pregão Presencial			
Contrato: 00153/2022		Processo:			
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra: 0095/2022	Categoria: 4 - REFORMA	Tipo: 5 - CRECHE		Data de Início: 22/12/2022	
Fonte de Recurso: 5 - PRÓPRIOS E FEDERAIS				Data Prevista: 22/12/2022	
Situação: 1 - EM ANDAMENTO				Data da Conclusão:	
Fica empenhada a importância de R\$ 65.170,92 (Sessenta e Cinco Mil, Cento e Setenta Reais e Noventa e Dois Centavos)					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/12/2022 LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA		Deduzida da Dotação: em: 22/12/2022 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	
				Pague-se em: ____/____/____ Ass.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA. Nº 430
CENTRO – ITABAIANA – PARAÍBA – CEP: 58.360-000
CNPJ: 09.072.430/0001-93

REQUERIMENTO DE DESPESA

DATA: 22/12/2022

ÓRGÃO SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB

IMPORTÂNCIA PEDIDA: R\$ 65.170,92

NOME DO CREDOR: JTS CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: R Otacílio de Albuquerque, 22-Torre -João Pessoa-PB

CNPJ: 11.958.594/0001-64

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviço

ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA

IMPORTÂNCIA

Solicitamos autorização, após análise do Controle Interno, para empenho e liquidação da despesa no valor de R\$65.170,92 (Sessenta e Cinco Mil Cento e Setenta Reais e Noventa e Dois Centavos) referente a primeira medição da recuperação da Creche Municipal Marluce Maria Almeida Borba.

CAIXA ECONÔMICA

AG: 1033

OP: 003

C/C: 3745-9

ISS 5%: 1.629,27 RETER

INSS 4,5%: 1.466,35 RETER

TOTAL: 65.170,92

R\$ 65.170,92

LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA	()	Nº
TOMADA DE PREÇO	()	Nº
CONVITE	()	Nº

CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

PREGÃO: 00016/2022

CONTRATO: 00181/2022-CPL

GEO: 0011/2022

FONTE DE RECURSOS:

FUNDEB-

CONTA: 13.796-0

AUTORIZO EMPENHAMENTO DE DESPESA:

SERVIÇO DE EMPENHAMENTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

09072430000193

AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000

FONE: (8) -

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

62.075,30

PAGUE-SE POR ESTE

CHEQUE A QUANTIA DE (SESSENTA E DOIS MIL, SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

A FM CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES LTDA

OU À SUA ORDEM

ITABAIANA/PB, 23 de DEZEMBRO de 2022

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 0164-3	Operação:	Conta Nº: 13796-0	Nº do Documento JTSCONST
Credor: FM CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES LTDA			CNPJ/CPF: 11.958.594/0001-64	
Endereço: RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE. 22		Complemento:		
Bairro: TORRE	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB			CEP: 58040-720

Classificação da Despesa: 2 PREFEITURA MUNICIPAL 07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2002 APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 1032 CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 0 Sem CO definido 099 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 0007266
	Data de Empenho: 22/12/2022
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 23/12/2022

Retenções: I.S.S. INSS	1.629,27 1.466,35
------------------------------	----------------------

Valor Bruto: 65.170,92	Total das Deduções: 3.095,62	Valor Líquido: 62.075,30
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 65.170,92 (Sessenta e Cinco Mil, Cento e Setenta Reais e Noventa e Dois Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

ITABAIANA/PB, 23 de DEZEMBRO de 2022

NÚMERO DO R.G.

FM CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1000117
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
B6DCIGHXW

DADOS BÁSICOS					
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
22/12/2022	22/12/2022	Sim			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL			NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
JTS CONSTRUÇOES LTDA			FM CONSTRUÇÕES		11.958.594/0001-64
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
1577417	Exigível		Não	Não	

LOGRADOURO					NÚMERO	
RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE					00022	
COMPLEMENTO			BAIRRO			
SALA 22 CXPST 06			TORRE			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58040-720	(83) 99196-6913	fmconstrucoes2010@gmail.com				

TOMADOR DOS SERVIÇOS				
NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		09.072.430/0001-93		
LOGRADOURO			NÚMERO	
AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA			422/430	
COMPLEMENTO		BAIRRO		
		CENTRO		
MUNICÍPIO		ESTADO		PAÍS
Itabaiana		PB		BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL		
58360-000				

SERVIÇOS PRESTADOS					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					

DESCRIÇÃO DETALHADA					
REFERENTE A PRIMEIRA Recuperação da Creche Municipal Marluce Maria Almeida Borba MEDIÇÃO MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA Total de serviço R\$ 65.170,92					
MATERIAIS APLICADOS 50% R\$ 32.585,46					
MAO DE OBRA 50% R\$ 32.585,46					
RETENÇÕES:					
ISS 5% R\$ 1.629,27					
INSS 4,5% 1.466,35					
TOTAL LIQUIDO R\$ 62.075,30					
CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA:1033 OP.003					
CONTA CORRENTE 3745-9 CAIXA ECONOMICA					

CATEGORIA INSCRICAO - CONSTRUÇÃO CIVIL					
CATEGORIA ITABAIANA					

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS
Itabaiana			PB		BRASIL

VALORES					
VALORES BÁSICOS					
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 65.170,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.585,46		

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

VALORES COMPLEMENTARES					
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00	R\$ 32.585,46	5.00 %	R\$ 1.629,27	R\$ 62.075,30	

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
---------------------------------	--	--	--	--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
----------------------------	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Atesto recebimento(s) do(s) material(ais)
ou a execução do(s) serviço(s) de
conformidade com a Nota Fiscal.

22 / 12 / 22



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.27
0164300164 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ITABAIANA -FEB
AGENCIA: 0164-3 CONTA: 13.796-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ITABAIANA -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1033-2 - CRUZ DAS ARMAS
CONTA: 3.745-9

FAVORECIDO: JTS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 11.958.594/0001-64
VALOR: R\$ 62.075,30
DEBITO EM: 23/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 9.80E.D0B.019.9F5.E43

1266



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

22/12/2022 11:54 - JOSE SEVERINO DO R. P. DE MELO JUNIOR

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
ISS
DAM 9940372842

ISS

Contribuinte:	JTS CONSTRUÇOES LTDA	Inscrição Municipal:	
Nome Fantasia:	FM CONSTRUÇOES	CPF/CNPJ:	11.958.594/0001-64
Endereço:	R OTACILIO DE ALBUQUERQUE, SALA 22 CXPST 06	Bairro:	TORRE
Complemento:	SALA 22 CXPST 06	CEP:	58040-720

ATIVIDADE PRINCIPAL

Especificação:	4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
----------------	-------------------------------------

DADOS PARA PAGAMENTO

Exercício:	2022	Parcela:	01	Vencimento:	30/12/2022	Não Receber Após:	30/12/2022
Observações: Pagável Exclusivamente no BANCO DO BRASIL S.A., através de seus CORRESPONDENTES BANCÁRIOS e CANAIS ELETRÔNICOS. RECOLHIMENTO DE ISS/QN PELA EMPRESA SOBRE NOTA FISCAL Nº1000117.				Valor do Tributo - R\$:		1.629,27	
				Atualização Monetária - R\$:		0,00	
				Multa de Mora - R\$:		0,00	
				Juros de Mora - R\$:		0,00	
				Taxa de Expediente - R\$:		0,00	
				Valor Devido - R\$:		1.629,27	

VIA CONTRIBUINTE

81620000016 3 29272004202 0 21230000000 8 09940372842 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
ISS
DAM 9940372842

ISS

Exercício:	2022	Parcela:	01	Vencimento:	30/12/2022	Inscrição:	
				Não Receber Após:	30/12/2022	Valor Devido - R\$	1.629,27
						Valor a Pagar - R\$	1.629,27

VIA PROCESSAMENTO

81620000016 3 29272004202 0 21230000000 8 09940372842 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

09072430000193

AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000

FONE: (8) -

GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - COMPETENCIA: 12/2022

Sequencia:	Documento:	Data:	Valor da Transferência:
0000004045	TRANSFER	23/12/2022	1.629,27

Órgão Responsável pela Transferência:

2 - Prefeitura Municipal

Conta Débito:

Órgão: 2 - Prefeitura Municipal
Código da Conta: 96
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 0164-3 - ITABAIANA
Operação:
Número: 12437-0
Título: BB I.S.S. - Impo s/Servi - 12.437-0

Conta Crédito:

Órgão: 2 - Prefeitura Municipal
Código da Conta: 104
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 0164-3 - ITABAIANA
Operação:
Número: 13796-0
Título: BB FUNDEB - 13.796,0

Finalidade:

TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NE 7266.

Assinatura Transferência:

Prefeito

Tesoureiro

23/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:46
016400164 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITABAIANA -FEB
AGENCIA: 0164-3 CONTA: 13.796-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.164.000.012.437
VALOR TOTAL	1.629,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN ITABAIANA ISSQN	
AGENCIA: 0164-3	CONTA: 12.437-0
NR. DOCUMENTO	550.164.000.013.796

=====

NR.AUTENTICACAO	5.01A.E5F.9A0.DCE.3BE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB811195 MARIA JOSE DA SILVA.

ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 01				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)			
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço: OS 0011/2022		14/12/2022		Prazo da Obra: 90 dias		8 dias	
Medição: Boletim de Medição Nº 01				Pregão de Presencial: PP 00016/2022				Prazo decorrido:		R\$103.009,08	
Obra: RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE Nº A. BORBA								Valor do contrato:		R\$65.170,92	
Serviços Medidos: Demolições/Remoções; Elevação; Cobertura; Revestimento; Pavimentação; Esquadrias; Instalações Elétricas; Pintura								Valor Acumulado das Medições:		R\$37.838,16	
Firma: FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI				Período: 15/12/2022		22/12/2022		Saldo do Contrato:			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO	Total
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Contratado	No período	Total		
1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES											
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	39,87	8,40	0,00	8,40	8,40	334,91	334,91	R\$	10.432,23
1.2	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	10,48	294,24	0,00	294,24	294,24	3.083,64	3.083,64	R\$	-
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	15,91	87,80	0,00	87,80	87,80	1.396,90	1.396,90	R\$	-
1.4	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	5,39	934,28	0,00	934,28	934,28	5.035,77	5.035,77	R\$	-
1.5	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	11,73	15,96	0,00	15,96	15,96	187,21	187,21	R\$	-
1.6	Demolição de reboco	m²	6,97	56,50	0,00	56,50	56,50	393,81	393,81	R\$	-
								10.432,23	10.432,23	R\$	2.265,76
2 ELEVACÃO											
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	40,46	56,00	0,00	56,00	56,00	2.265,76	2.265,76	R\$	-
								2.265,76	2.265,76	R\$	14.678,44
3 COBERTURA											
3.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, lãbaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	75,69	116,00	0,00	116,00	116,00	8.780,04	8.780,04	R\$	-
3.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	57,73	48,00	0,00	48,00	48,00	2.771,04	2.771,04	R\$	-
3.3	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshroll da Tégula ou similar	m²	27,86	16,00	0,00	16,00	16,00	445,76	445,76	R\$	-
3.4	Lona plástica preta	M	4,19	640,00	0,00	640,00	640,00	2.681,60	2.681,60	R\$	-
								14.678,44	14.678,44	R\$	6.128,67
4 FORRO											
4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	29,38	208,60	0,00	208,60	208,60	6.128,67	6.128,67	R\$	6.128,67
								6.128,67	6.128,67	R\$	6.782,17
5 REVESTIMENTO											
5.1 PAREDE											
5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2,96	112,50	0,00	112,50	112,50	333,00	333,00	R\$	-
5.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,64	112,50	0,00	112,50	112,50	2.434,50	2.434,50	R\$	-
5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	58,78	68,30	0,00	68,30	68,30	4.014,67	4.014,67	R\$	4.014,67
								6.782,17	6.782,17	R\$	6.782,17

Anália Cristina de Jesus Carvalho

Engenheira Civil

CREA-PB Nº 1619551446

6	PAVIMENTAÇÃO										R\$ 8.737,74
6.1	INTERNO										R\$ 6.984,22
6.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	m²	21,97	128,60	0,00	128,60	128,60	-	2.825,34	2.825,34	
6.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	46,65	63,35	0,00	63,35	63,35	-	2.955,28	2.955,28	
6.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL D DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	5,90	204,00	0,00	204,00	204,00	-	1.203,60	1.203,60	
6.2	EXTERNO										R\$ 1.753,52
6.2.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	40,04	25,55	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	
6.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	35,12	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	
7	ESQUADRIAS										R\$ 6.067,50
7.1	PORTAS										R\$ 3.200,28
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	800,07	2,00	0,00	2,00	2,00	-	1.600,14	1.600,14	
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	800,07	2,00	0,00	2,00	2,00	-	1.600,14	1.600,14	
7.2	JANELAS										R\$ 2.867,22
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	637,16	4,50	0,00	4,50	4,50	-	2.867,22	2.867,22	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 8.196,24
8.1	Ponto de luz em tecto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pl	271,82	4,00	0,00	4,00	4,00	-	1.087,28	1.087,28	
8.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pl	76,14	31,00	0,00	31,00	31,00	-	2.360,34	2.360,34	
8.3	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pl	82,77	35,00	0,00	35,00	35,00	-	2.896,95	2.896,95	
8.4	LAMPADA DE LED 25W	und	32,57	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,87	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
8.6	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	320,76	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										R\$ 5.291,44
9.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	110,69	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
9.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	76,48	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
9.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	146,52	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	
9.4	Ponto de água fria embutido, c/ material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	160,56	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	

Fábio Henrique da Silva Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161923107-7

Analia Cristina Gonzalez Civil
Engineer No. 161955146
CREA-PB No. 161955146

COM BDI INCLUSO

Amalia Carolina Gonçalves de Carvalho
Engenharia Civil

ENGENHEIRO CIVIL
Representante da Engenharia Contratada

Engenharia Civil

Lúcio Flavio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

15/12/2022 A 22/12/2022

CONSTRUTORA: FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI

OBRA: RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE M^ª ALMEIDA BORBA

PREGÃO PRESENCIAL: PP 0016/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 0011/2022



FOTO 01 - REVISÃO DA COBERTA



FOTO 02 - LONA PLÁSTICA

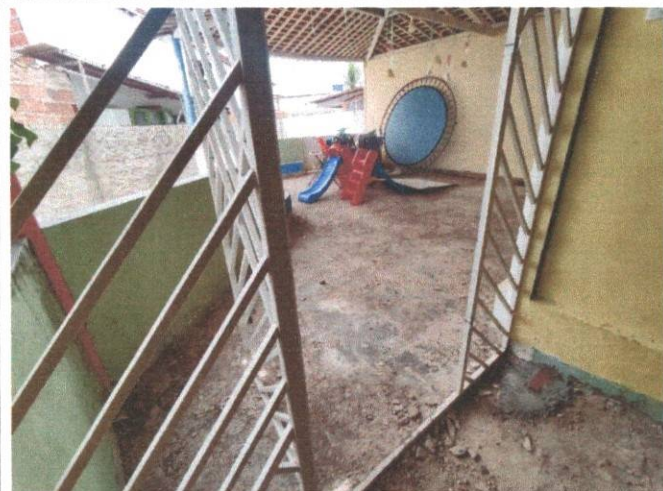


FOTO 03 - DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO



FOTO 04 - DEMOLIÇÃO DO CONTRAPISO

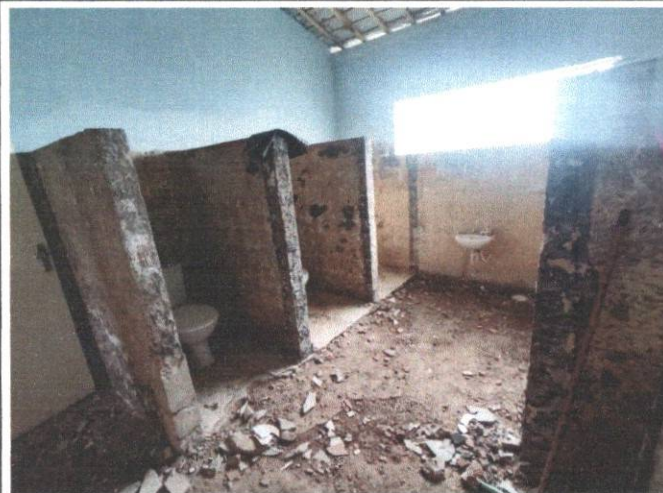


FOTO 05 - DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO



FOTO 06 - EXECUÇÃO DO NOVO CONTRAPISO

Fábio Henrique da Silva Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PB 161923107-7

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA-PB Nº 1619551446



FOTO 07 - NOVO CONTRAPISO



FOTO 08 - ESQUADRIAS

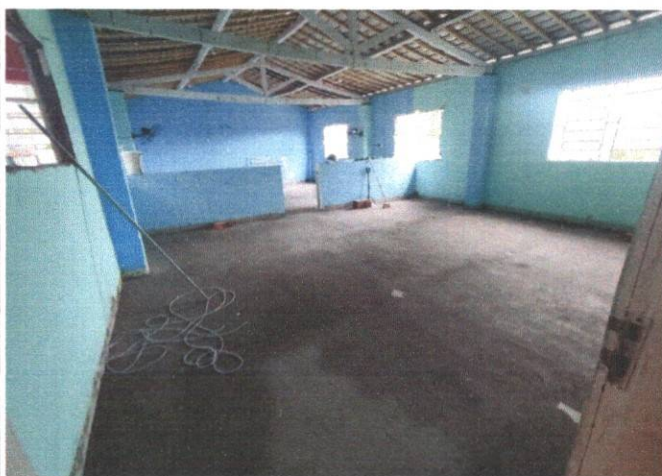


FOTO 09 - CONTRAPISO



FOTO 10 - ESQUADRIA

Fábio Henrique da Silva Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161923107-7

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA/PB N° 1619551446

4



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JTS CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.958.594/0001-64

Certidão nº: 34172423/2022

Expedição: 10/10/2022, às 14:14:03

Validade: 08/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JTS CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.958.594/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **F5F1.E07A.ECF6.A16F**

Emitida no dia 07/12/2022 às 11:21:36

Nome Empresarial:

FM CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES LTDA

Endereço:

ANIZIO PEREIRA BORGES

Bairro:

LIBERDADE

Inscr. Estadual:

16.168.975-2

Município:

SANTA RITA

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

Número:

111

CNPJ/CPF:

11.958.594/0001-64

Complemento:

SALA A

CEP:

58300-580

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FM CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES EIRELI
CNPJ: 11.958.594/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:38 do dia 22/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2023.

Código de controle da certidão: **EC31.8738.DDD9.9C4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 05/12/2022
Hora: 11:00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2022/127368

Nº de Controle de Autenticação

498.563.615.637

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 11958594000164	Nome do Contribuinte JTS CONSTRUCOES LTDA				
Endereço RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE		Número 00022	Apto/Sala 	Bloco 	Complemento SALA 22 CXPST 06
Bairro TORRE	CEP 58040720	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Reservado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 157741-7

IMOBILIÁRIAS: 127074-5

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente em 05/12/2022 11:00:50

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.958.594/0001-64

Razão Social: TS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: R OTACILIO DE ALBUQUERQUE 22 SL 22 CXPST 06 / TORRE /
JOAO PESSOA / PB / 58040-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/11/2022 a 27/12/2022

Certificação Número: 2022112801025572786036

Informação obtida em 14/12/2022 12:09:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
