



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ: 09.072.430/0001-93

**OBRA – CRECHE MARLUCE
MARIA BORBA**

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

VALOR: R\$ 37.838,16

	EMPENHO
	LIQUIDAÇÃO
	NOTA FISCAL
	BOLETIM DE MEDIÇÃO
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
	MEMÓRIA DE CALCULO
	PAGAMENTO+ENCARGOS (INSS - ISS)
	CERTIDÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

09072430000193
AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000
FONE: (8) -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000624	Data de Emissão: 08/02/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 287	Unidade Orçamentária: 0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
--------------------------------	---

Classificação da Despesa: 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2002 - APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 1035 - CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542 / 0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 42.170,60 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 42.170,60 Este Empenho: 37.838,16 Saldo da Dotação: 4.332,44
--	--

Credeciado: FM CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES LTDA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☒ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.958.594/0001-64
Endereço: RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE. 22	Complemento:	
Bairro: TORRE	Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB	CEP: 58040-720

Especificação da Despesa: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGUN DO BM DA RECUPERA~JAO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE MARIA ALMEIDA BORBA, CONFORME COMPROVANTE.
--

Tipo de Meta: 4 - RAS	Convênio:	Valor da Despesa: 37.838,16
---------------------------------	-----------	---------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00016/2022	Modalidade: 11-Pregão Presencial
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra: 0095/2022	Categoria: 4 - REFORMA	Tipo: 5 - CRECHE	Data de Início: 22/12/2022
Fonte de Recurso: 5 - PRÓPRIOS E FEDERAIS			Data Prevista: 22/12/2022
Situação: 1 - EM ANDAMENTO			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 37.838,16 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Dezesseis Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 08/02/2023	Deduzida da Dotação: em: 08/02/2023	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA. Nº 430
CENTRO – ITABAIANA – PARAÍBA – CEP: 58.360-000
CNPJ: 09.072.430/0001-93

REQUERIMENTO DE DESPESA

DATA: 08/02/2023

ÓRGÃO SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB

IMPORTÂNCIA PEDIDA: R\$ 37.838,16

NOME DO CREDOR: JTS CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: R Otacílio de Albuquerque, 22-Torre -João Pessoa-PB

CNPJ: 11.958.594/0001-64

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviço

ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA

IMPORTÂNCIA

Solicitamos autorização, após análise do Controle Interno, para empenho e liquidação da despesa no valor de R\$37.838,16 (Trinta e Sete Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Dezesesseis Centavos) referente a Segunda medição da recuperação da Creche Municipal Marluce Maria Almeida Borba.

CAIXA ECONÔMICA

AG: 1033

OP: 003

C/C: 3745-9

ISS 5%: 945,95 RETER

INSS 4,5%: 851,31 RETER

TOTAL: 37.838,16

R\$ 37.838,16

LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA [] Nº

TOMADA DE PREÇO [] Nº

CONVITE [] Nº

CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

PREGÃO: 00016/2022

CONTRATO: 00181/2022-CPL

GEO: 0011/2022

PRAZO DE VIGÊNCIA:

13/04/2023

FONTE DE

RECURSOS:

FUNDEB-

CONTA: 13.796-0

AUTORIZO EMPENHAMENTO DE DESPESA:

SERVIÇO DE EMPENHAMENTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1000132
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BNNJKIZLC

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
08/02/2023	08/02/2023	Sim			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA	CPF / CNPJ
JTS CONSTRUÇÕES LTDA	FM CONSTRUÇÕES	11.958.594/0001-64
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO
1577417	Exigível	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
		Optante pelo SIMEI
		Não

LOGRADOURO	NÚMERO
RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE	00022

COMPLEMENTO	BAIRRO
SALA 22 CXPST 06	TORRE

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58040-720	(83) 99196-6913	fmconstrucoes2010@gmail.com

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	09.072.430/0001-93	

LOGRADOURO	NÚMERO
RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA	422/430

COMPLEMENTO	BAIRRO
	CENTRO

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Itabaiana	PB	BRASIL

CEP	TELEFONE	E-MAIL
58360-000		

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DETALHADA

REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA Recuperação da Creche Municipal Marluce Maria Almeida
Total de serviço R\$ 37.838,16

Material Aplicado 50% R\$ 18.919,08
Mão de Obra 50% R\$ 18.919,08
Iss Retido 5% R\$ 945,95
Inss retido 4,5 R\$ 851,31
Total Líquido R\$ 36.040,90
CONTA PARA DEPOSITO: AGENCIA:1033 OP.003
CONTA CORRENTE 3745-9 CAIXA ECONÔMICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Atesto recebimento(s) do(s) material(ais)
ou a execução do(s) serviço(s) de
conformidade com a Nota Fiscal.

08/02/23

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL

RA ITABAIANA

LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Itabaiana	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 37.838,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.919,08

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 18.919,08	5.00 %	R\$ 945,95	R\$ 36.040,90

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO			BM 02			VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)		
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento			Ordem de Serviço:	05/0011/2022	14/12/2022			
Medição: Boletim de Medição Nº 01			Pregão de Presencial:	PP 00016/2022				
Obra: RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIUCE MARIA A. BORBA						Prazo da Obra:	90 dias	
Serviços Medidos: Forro; Revestimento; Pavimentação; Instalações Elétricas; Instalações Hidrossanitárias; Louças e Metais; Pintura						Prazo decorrido:	56 dias	
Firma: FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI						Valor do contrato:	R\$103.009,08	
						Valor Acumulado das Medições:	R\$103.009,08	
						Saldo do Contrato:		R\$0,00
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO	
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Saldo	Total
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES								
1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	39,87	8,40	8,40	0,00	-	334,91
1.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	10,48	294,24	294,24	0,00	-	3.083,64
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	15,91	87,80	87,80	0,00	-	1.396,90
1.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	5,39	934,28	934,28	0,00	-	5.035,77
1.4	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	11,73	15,96	15,96	0,00	-	187,21
1.5	Demolição de reboco	m²	6,97	56,50	56,50	0,00	-	393,81
1.6							-	10.432,23
2	ELEVACÃO							
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	40,46	56,00	56,00	0,00	-	2.265,76
3	COBERTURA							
3.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, lã basalto ou similar, com reposição de 30% do material	m²	75,69	116,00	116,00	0,00	-	8.780,04
3.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	57,73	48,00	48,00	0,00	-	2.771,04
3.3	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoli da Tégula ou similar	m²	27,86	16,00	16,00	0,00	-	445,76
3.4	Lona plástica preta	M	4,19	640,00	640,00	0,00	-	2.681,60
4	FORRO							
4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	29,38	208,60	208,60	0,00	-	6.128,67
5	REVESTIMENTO							
5.1	PAREDE							
5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2,96	112,50	112,50	0,00	-	333,00
5.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,64	112,50	112,50	0,00	-	2.434,50
5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	56,78	68,30	68,30	0,00	-	4.014,67
							-	6.782,17
							-	6.782,17

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 1619551413

Fábio Henrique da Silva Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161923107-7

6	PAVIMENTAÇÃO INTERNO									R\$ 8.737,74 R\$ 6.984,22
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	m²	21,97	128,60	0,00	128,60	-	0,00	2.825,34	2.825,34
6.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	46,65	63,35	0,00	63,35	-	0,00	2.955,28	2.955,28
6.1.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL D DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	5,90	204,00	0,00	204,00	-	0,00	1.203,60	1.203,60
6.1.3									6.984,22	6.984,22
6.2	EXTERNO									R\$ 1.753,52
6.2.1	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	40,04	25,55	0,00	25,55	-	1.023,02	1.023,02	R\$ -
6.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	35,12	20,80	0,00	20,80	-	730,50	730,50	R\$ -
7	ESQUADRIAS								1.753,52	1.753,52
7.1	PORTAS									R\$ 6.067,50 R\$ 3.200,28
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	800,07	2,00	0,00	2,00	-	0,00	1.600,14	R\$ -
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	800,07	2,00	0,00	2,00	-	0,00	1.600,14	R\$ -
7.2	JANELAS								3.200,28	3.200,28
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	637,16	4,50	0,00	4,50	-	0,00	2.867,22	R\$ -
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								2.867,22	2.867,22
8.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	271,82	4,00	0,00	4,00	-	0,00	1.087,28	R\$ -
8.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	76,14	31,00	0,00	31,00	-	0,00	2.360,34	R\$ -
8.3	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	82,77	35,00	0,00	35,00	-	0,00	2.896,95	R\$ -
8.4	LAMPADA DE LED 25W	und	32,57	44,00	0,00	44,00	-	1.433,08	1.433,08	R\$ -
8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,87	9,00	0,00	9,00	-	97,83	97,83	R\$ -
8.6	Quadro de distribuição de embutr, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	320,76	1,00	0,00	1,00	-	320,76	320,76	R\$ -
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								8.196,24	8.196,24
9.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	110,69	4,00	0,00	4,00	-	442,76	442,76	R\$ -
9.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	76,48	8,00	0,00	8,00	-	611,84	611,84	R\$ -
9.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	146,52	7,00	0,00	7,00	-	1.025,64	1.025,64	R\$ -
9.4	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	160,56	20,00	0,00	20,00	-	3.211,20	3.211,20	R\$ -

Anália Cristina Gomes de Carvalho
 Engenheira Civil

CREA-BB N° 1619551446

LOUÇAS E METAIS										5.291,44	5.291,44	R\$ 2.275,96
10												
10.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	196,13	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	196,13	196,13	R\$ -
10.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	395,19	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1.580,76	1.580,76	R\$ -
10.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	63,09	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	189,27	189,27	R\$ -
10.4	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	77,45	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	309,80	309,80	R\$ -
										2.275,96	2.275,96	
11	PINTURA											R\$ 32.152,93
11.1	PAREDES											R\$ 23.553,20
11.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,12	934,28	467,14	467,14	467,14	467,14	934,28	1.980,67	980,34	R\$ -
11.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,77	934,28	467,14	467,14	467,14	467,14	934,28	10.996,48	5.498,24	R\$ -
11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	11,32	934,28	467,14	467,14	467,14	467,14	934,28	10.576,05	5.288,02	R\$ -
										23.553,20	11.776,60	R\$ 7.572,18
11.2	TETO											R\$ -
11.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,44	208,60	104,30	104,30	104,30	104,30	208,60	508,98	254,49	R\$ -
11.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	21,01	208,60	104,30	104,30	104,30	104,30	208,60	4.382,69	2.191,34	R\$ -
11.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,85	208,60	104,30	104,30	104,30	104,30	208,60	2.680,51	1.340,25	R\$ -
										7.572,18	3.786,08	R\$ 1.027,55
11.3	ESQUADRIAS											R\$ -
11.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,35	45,78	22,89	22,89	22,89	22,89	45,78	473,82	236,91	R\$ -
11.3.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m²	32,96	16,80	8,40	8,40	8,40	8,40	16,80	553,73	276,86	R\$ -
										1.027,55	513,77	R\$ 1.027,55
TOTAL COM BDI INCLUSO										R\$ 103.099,08	R\$ 37.838,16	R\$ 103.099,08
										36,73%	100,00%	

Fábio Henrique da Silva Barbosa
Representante da Empresa Contratada
CREA/PB 161923107-7

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

Lucio Flavio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93

QUANTITATIVOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE Mª A. BORBA	BM 02
CONTRATADA:	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	
PERÍODO:	23/12/2022 a 08/02/2023	

4 FORRO

4.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P

	Área
TODOS OS AMBIENTES INTERNOS	208,60 m²

TOTAL MEDIDO	208,60 m²
--------------	-----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 m²
MEDIÇÃO ATUAL	208,60 m²
TOTAL ACUMULADO	208,60 m²

5 REVESTIMENTO

5.1 PAREDE

5.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	68,30 M2

TOTAL MEDIDO	68,30 M2
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 M2
MEDIÇÃO ATUAL	68,30 M2
TOTAL ACUMULADO	68,30 M2

6 PAVIMENTAÇÃO

6.2 EXTERNO

6.2.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	25,55 M2

TOTAL MEDIDO	25,55 M2
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 M2
MEDIÇÃO ATUAL	25,55 M2
TOTAL ACUMULADO	25,55 M2

6.2.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	20,80 M2

TOTAL MEDIDO	20,80 M2
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 M2
MEDIÇÃO ATUAL	20,80 M2
TOTAL ACUMULADO	20,80 M2

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.4 LAMPADA DE LED 25W

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	44,00 UND

TOTAL MEDIDO	44,00 UND
--------------	-----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00 UND
MEDIÇÃO ATUAL	44,00 UND
TOTAL ACUMULADO	44,00 UND

8.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	9,00 UND

TOTAL MEDIDO	9,00 UND
--------------	----------

Fábio Henrique da Silva Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161923107-7

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 1619551446

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	9,00	UND
TOTAL ACUMULADO	9,00	UND

8.6 Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	1,00 UND

TOTAL MEDIDO	1,00 UND
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	1,00	UND
TOTAL ACUMULADO	1,00	UND

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**9.1 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)**

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	4,00 UND

TOTAL MEDIDO	4,00 UND
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	4,00	UND
TOTAL ACUMULADO	4,00	UND

9.2 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	8,00 UND

TOTAL MEDIDO	8,00 UND
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	8,00	UND
TOTAL ACUMULADO	8,00	UND

9.3 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	7,00 UND

TOTAL MEDIDO	7,00 UND
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	7,00	UND
TOTAL ACUMULADO	7,00	UND

9.4 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	20,00 UND

TOTAL MEDIDO	20,00 UND
--------------	-----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	20,00	UND
TOTAL ACUMULADO	20,00	UND

10 LOUÇAS E METAIS**10.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM**

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	1,00 UND

TOTAL MEDIDO	1,00 UND
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	1,00	UND
TOTAL ACUMULADO	1,00	UND

10.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	4,00 UND

TOTAL MEDIDO	4,00 UND
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
---------------------	------	-----

Fábio Henrique da Silva Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161923107-7

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 1619551446

MEDICÃO ATUAL	4,00	UND
TOTAL ACUMULADO	4,00	UND

10.3 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3,00 UND

TOTAL MEDIDO	3,00 UND
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDICÃO ATUAL	3,00	UND
TOTAL ACUMULADO	3,00	UND

10.4 Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc

	UNIDADE
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	4,00 UND

TOTAL MEDIDO	4,00 UND
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDICÃO ATUAL	4,00	UND
TOTAL ACUMULADO	4,00	UND

11 PINTURA

11.1 PAREDES

11.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	467,14 M2

TOTAL MEDIDO	467,14 M2
--------------	-----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	467,14	M2
MEDICÃO ATUAL	467,14	M2
TOTAL ACUMULADO	934,28	M2

11.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	467,14 M2

TOTAL MEDIDO	467,14 M2
--------------	-----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	467,14	M2
MEDICÃO ATUAL	467,14	M2
TOTAL ACUMULADO	934,28	M2

11.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	467,14 M2

TOTAL MEDIDO	467,14 M2
--------------	-----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	467,14	M2
MEDICÃO ATUAL	467,14	M2
TOTAL ACUMULADO	934,28	M2

11.2 TETO

11.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	104,30 M2

TOTAL MEDIDO	104,30 M2
--------------	-----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	104,30	M2
MEDICÃO ATUAL	104,30	M2
TOTAL ACUMULADO	208,60	M2

11.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	104,30 M2

TOTAL MEDIDO	104,30 M2
--------------	-----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	104,30	M2
MEDICÃO ATUAL	104,30	M2
TOTAL ACUMULADO	208,60	M2

11.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Fábio Henrique da Silva Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161923107-7

Anaíla Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA/PB Nº 1619551446

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	104,30 M2

TOTAL MEDIDO	104,30 M2
--------------	-----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	104,30 M2
MEDIÇÃO ATUAL	104,30 M2
TOTAL ACUMULADO	208,60 M2

11.3 ESQUADRIAS**11.3.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	22,89 M2

TOTAL MEDIDO	22,89 M2
--------------	----------

MEDIÇÕES ANTERIORES	22,89 M2
MEDIÇÃO ATUAL	22,89 M2
TOTAL ACUMULADO	45,78 M2

11.3.2 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	8,40 M2

TOTAL MEDIDO	8,40 M2
--------------	---------

MEDIÇÕES ANTERIORES	8,40 M2
MEDIÇÃO ATUAL	8,40 M2
TOTAL ACUMULADO	16,80 M2

[Assinatura]
 Analia Cristina Gonçalves de Araújo
 Engenheira Civil
 CREA-PB 161923107-7



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

23/12/2022 A 08/02/2023

CONSTRUTORA: FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI

OBRA: RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARLUCE M^ª ALMEIDA BORBA

PREGÃO PRESENCIAL: PP 0016/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 0011/2022



FOTO 01 - FORRO DE GESSO

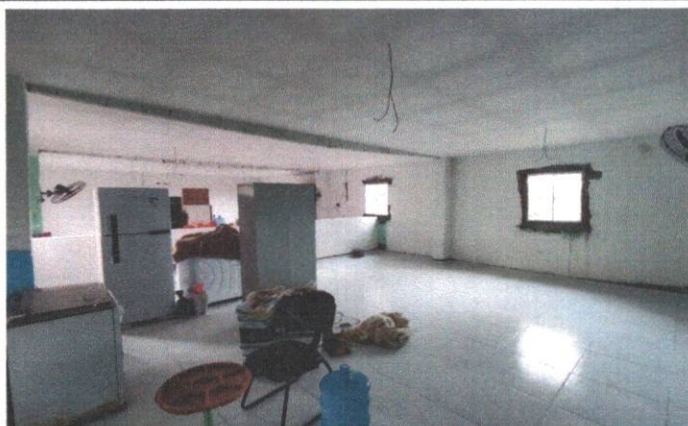


FOTO 02 - PISO



FOTO 03 - REVESTIMENTO CERÂMICO



FOTO 04 - REVSTIMENTO CERÂMICO



FOTO 05 - PINTURA



FOTO 06 - PINTURA

Fábio Henrique da Silva Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRE/PB 161923107-7

Carla Maria Alves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CRE/PB 1619551446

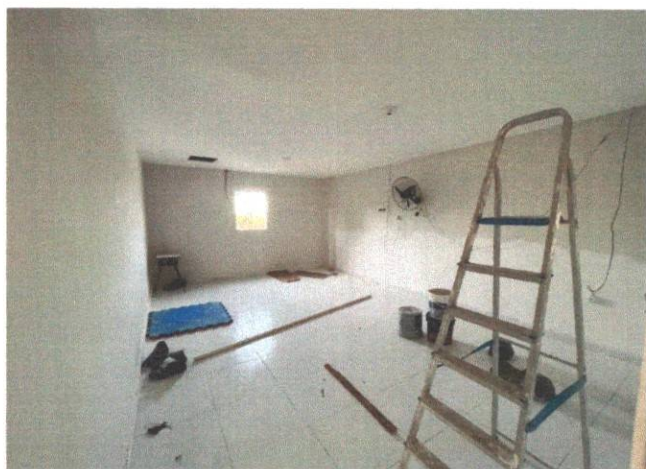


FOTO 07 - RODAPÉ



FOTO 08 - CORREDOR

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA/PB Nº 1619551446

Fábio Henrique da Silva Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161923107-7



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 42AB.0505.DF6F.298D

Emitida no dia 23/01/2023 às 13:21:21

Nome Empresarial:

FM CONSTRUÇOES E ADMINISTRACOES LTDA

Endereço:

ANIZIO PEREIRA BORGES

Número:

111

Complemento:

SALA A

Bairro:

LIBERDADE

Município:

SANTA RITA

CEP:

58300-580

Inscr. Estadual:

16.168.975-2

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

CNPJ/CPF:

11.958.594/0001-64

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JTS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 11.958.594/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:50 do dia 24/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2023.

Código de controle da certidão: **6643.0DD3.62CD.2C0D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.958.594/0001-64

Razão Social: TS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: R OTACILIO DE ALBUQUERQUE 22 SL 22 CXPST 06 / TORRE /
JOAO PESSOA / PB / 58040-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2023 a 22/02/2023

Certificação Número: 2023012401130561798949

Informação obtida em 08/02/2023 12:19:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JTS CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.958.594/0001-64

Certidão nº: 34172423/2022

Expedição: 10/10/2022, às 14:14:03

Validade: 08/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JTS CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.958.594/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 23/01/2023
Hora: 13:19

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2023/008067

Nº de Controle de Autenticação

539.563.483.572

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 11958594000164	Nome do Contribuinte JTS CONSTRUCOES LTDA			
Endereço RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE	Número 00022	Apto/Sala	Bloco	Complemento SALA 22 CXPST 06
Bairro TORRE	CEP 58040720	Cidade JOAO PESSOA		UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 157741-7

IMOBILIÁRIAS: 127074-5

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente em 23/01/2023 13:19:46
