



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ: 09.072.430/0001-93

OBRA – ESCOLA DRº ANTONIO BATISTA SANTIAGO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

VALOR: R\$ 72.448,37

	EMPENHO
	LIQUIDAÇÃO
	NOTA FISCAL
	BOLETIM DE MEDIÇÃO
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
	MEMÓRIA DE CALCULO
	PAGAMENTO+ENCARGOS (INSS - ISS)
	CERTIDÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 09.072.430/0001-93

AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000

FONE: (8) -

OK

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0007591	Data de Emissão: 30/12/2022	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 220	Unidade Orçamentária: 0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
--------------------------------	--

Classificação da Despesa: 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2002 - APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 1032 - CONSTRUIR, AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0 - Sem CO definido SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 174.338,17 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 174.338,17 Este Empenho: 174.292,18 Saldo da Dotação: 45,99
---	--

Credor: MD2 ENGENHARIA EIRELI	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 21.484.295/0001-99
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA DA ESCOLA DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
--

Tipo de Despesa: 4 - OBRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 174.292,18
-------------------------------	-----------	--

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00007/2022	Modalidade: 2-Tomada de Preço
Contrato: 00182/2022	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra: 0100/2022	Categoria: 5 - AMPLIAÇÃO E RECUPER.	Tipo: 7 - ESCOLA	Data de Início: 30/12/2022
Fonte de Recurso: 5 - PRÓPRIOS E FEDERAIS			Data Prevista: 28/02/2023
Situação: 1 - EM ANDAMENTO			Data da Conclusão: 28/02/2023

Fica empenhada a importância de R\$ 174.292,18 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Dezoito Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/12/2022 LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA	Deduzida da Dotação: em: 30/12/2022 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA. Nº 430
CENTRO – ITABAIANA – PARAÍBA – CEP: 58.360-000
CNPJ: 09.072.430/0001-93

REQUERIMENTO DE DESPESA

DATA: 30/12/2022

ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana-PB

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana-PB

IMPORTÂNCIA PEDIDA:

NOME DO CREDOR: MD2 ENGENHARIA EIRELI

ENDEREÇO: Fazenda Boa Vista, 178-Zona Rural -São Vicente Ferrer -PE

CNPJ: 21.484.295/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviço

ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA

IMPORTÂNCIA

Solicitamos autorização, após análise do Controle Interno, para empenho e liquidação da despesa no valor de R\$174.292,18 (Cento e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Dezoito Centavos) referente aos serviços prestados com a reforma da Escola DR. Antonio Batista Santiago.

BANCO DO BRASIL

AG: 0063-9

CONTA: 20000-X

TOTAL: R\$ 174.292,18

R\$ 174.292,18

LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA	()	Nº
TOMADA DE PREÇO	()	Nº
CONVITE	()	Nº

CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES:

PREGÃO: 0007/2022

CONTRATO: 00182/2022

FONTE DE RECURSOS:

FUNDEB

AUTORIZO EMPENHAMENTO DE DESPESA:

SERVIÇO DE EMPENHAMENTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

09072430000193

AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000

FONE: (8) -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000537	Data de Emissão: 13/03/2023	Código: 38 - RESTOS A PAGAR
Credor: MD2 ENGENHARIA EIRELI		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 21.484.295/0001-99
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: VA QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA DA ESCOLA DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano: 2022
	Número do Empenho: 0007591
	Parcela: 1

Retenções:

Valor Bruto: 72.448,37	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 72.448,37
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Conta:	Agência: 0164-3 C/C: 13796-0 BB FUNDEB - 13.796,0
Nº do Cheque:	MD2

Ass. Ordenador de Despesas: em: 13/03/2023	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Tesoureiro: em: ____/____/____
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 72.448,37 (Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

ITABAIANA/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

MD2 ENGENHARIA EIRELI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rodovia PE-89 N° S/N - Centro, CEP 55860-000 - São Vicente Férrer - PE
TEL.: (81)3655-1223 CNPJ: 11.361.896/0001-50



Número da Nota:

00000019

Competência:

MAR/2023

Data e Hora Emissão:

10/03/2023 14:00:37

Código de Verificação:

JKHL-ATJB8

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

ITABAIANA - PB

Local da Prestação:

ITABAIANA - PB

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ:

21.484.295/0001-99

Inscrição Municipal:

886

Nome/Razão Social:

MD2 ENGENHARIA EIRELI

Endereço:

FAZ BOA VISTA ,ZONA RURAL. 178

Município:

UF: **PE**

CEP: **0**

E-mail:

md2engenhariaeconstrucoes@gmail.com

TEL: **8198349799**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

09.072.430/0001-93

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB

Endereço:

AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422/430 CENTRO

Município:

ITABAIANA

UF: **PB**


CEP: **58360000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO #QTD:1 - V.UND.:R\$72.448,37 - TOTAL:R\$72.448,37 - DED.:R\$43.469,02

CONTRATO 00182/2022
TOMADA DE PREÇO 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220818TP00007
60% MATERIAIS - R\$43.469,0240% MAO DE OBRA - R\$28.979,35

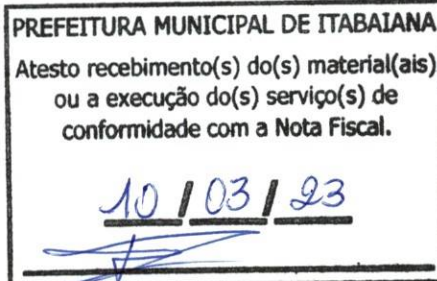

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.448,37

Atividade Prestada:

4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
72.448,37	43.469,02	28.979,35	2,01%	582,48
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 700/2001 de 28 de dezembro de 2001.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

510508157758491

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saovicenteferrer/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.35
0164300164 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ITABAIANA -FEB
AGENCIA: 0164-3 CONTA: 13.796-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ITABAIANA -FEB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1449-4 - JOAO PESSOA EPITACIO
CONTA: 98.871-4

FAVORECIDO: MD2 ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 21.484.295/0001-99
VALOR: R\$ 72.448,37
DEBITO EM: 13/03/2023
=====

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 7.85E.C63.E0C.898.D62

Transação efetuada com sucesso por: JB811195 MARIA JOSE DA SILVA.



ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM 01

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)

72.448,37

Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço:		OS 0012/2022				19/12/2022					
Medição: Boletim de Medição Nº 01				Tomada de Preço:		TP 0007/2022						Prazo da Obra:		90 dias	
Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO												Prazo decorrido:		80 dias	
Serviços Medidos: Serviços Preliminares; Infraestrutura; Superestrutura; Elevação; Esquadria; Revestimento; Inst. Elétricas; Ventilação; Cobertura/Forro												Valor do contrato:		R\$174.292,18	
												Valor Acumulado das Medições:		R\$72.448,37	
Firma: MD2 ENGENHARIA EIRELI				Período:		20/12/2022		10/03/2023				Saldo do Contrato:		R\$101.848,81	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO			
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$	4.464,58	
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	296,91	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	1.336,09	0,00	0,00	R\$	1.336,09		
1.2	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	32,25	4,79	0,00	4,79	4,79	-	154,47	154,47	154,47	R\$	-		
1.3	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	41,79	0,23	0,00	0,23	0,23	-	9,61	9,61	9,61	R\$	-		
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,43	9,03	0,00	9,03	9,03	-	76,12	76,12	76,12	R\$	-		
1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	31,91	2,00	0,00	2,00	2,00	-	63,82	63,82	63,82	R\$	-		
1.6	Remoção de pia	m²	22,72	0,79	0,00	0,79	0,79	-	17,94	17,94	17,94	R\$	-		
1.7	Remoção de vaso sanitário	un	13,86	1,00	0,00	1,00	1,00	-	13,86	13,86	13,86	R\$	-		
1.8	Demolição de piso de alta resistência	m²	21,50	4,88	0,00	4,88	4,88	-	104,92	104,92	104,92	R\$	-		
1.9	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	7,18	106,63	0,00	106,63	106,63	-	765,60	765,60	765,60	R\$	-		
1.10	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	255,63	1,64	0,00	1,64	1,64	-	419,23	419,23	419,23	R\$	-		
1.11	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	21,50	33,51	0,00	33,51	33,51	-	720,46	720,46	720,46	R\$	-		
1.12	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	15,03	6,37	0,00	6,37	6,37	-	95,74	95,74	95,74	R\$	-		
1.13	Remoção de torneira	un	5,28	2,00	0,00	2,00	2,00	-	10,56	10,56	10,56	R\$	-		
1.14	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	21,69	6,84	0,00	6,84	6,84	-	148,35	148,35	148,35	R\$	-		
1.15	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	4,95	106,63	0,00	106,63	106,63	-	527,81	527,81	527,81	R\$	-		
									4.464,58	3.128,49	3.128,49				
2	INFRAESTRUTURA											R\$	3.470,46		
2.1	SAPATAS ISOLADAS											R\$	1.092,22		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	95,80	1,13	0,00	1,13	1,13	-	108,25	108,25	108,25	R\$	-		
2.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	5,80	2,52	0,00	2,52	2,52	-	14,61	14,61	14,61	R\$	-		
2.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	141,94	4,48	0,00	4,48	4,48	-	635,89	635,89	635,89	R\$	-		
2.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	28,08	0,13	0,00	0,13	0,13	-	3,65	3,65	3,65	R\$	-		
2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,99	2,09	0,00	2,09	2,09	-	31,32	31,32	31,32	R\$	-		
2.1.6	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	421,92	0,45	0,00	0,45	0,45	-	189,86	189,86	189,86	R\$	-		
2.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	204,32	0,45	0,00	0,45	0,45	-	91,94	91,94	91,94	R\$	-		
2.1.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	30,37	0,55	0,00	0,55	0,55	-	16,70	16,70	16,70	R\$	-		

Andréa Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB N° 161.661/46

									1.092,22	1.092,22	1.092,22	
2.2	EMBASAMENTO E CIMENTADO											R\$ 2.378,24
2.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	95,80	0,43	0,00	0,43	0,43	-	41,19	41,19	41,19	R\$ -
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	5,80	8,14	0,00	8,14	8,14	-	47,21	47,21	47,21	R\$ -
2.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	36,96	53,83	0,00	53,83	53,83	-	1.989,55	1.989,55	1.989,55	R\$ -
2.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	70,94	1,74	0,00	1,74	1,74	-	123,43	123,43	123,43	R\$ -
2.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	94,58	1,87	0,00	1,87	1,87	-	176,86	176,86	176,86	R\$ -
									2.378,24	2.378,24	2.378,24	
3	SUPERESTRUTURA											R\$ 4.182,84
3.1	PILARES											R\$ 2.999,53
3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	43,10	21,13	0,00	21,13	21,13	-	910,70	910,70	910,70	R\$ -
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,55	15,74	0,00	15,74	15,74	-	307,71	307,71	307,71	R\$ -
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,92	74,16	0,00	74,16	74,16	-	1.106,46	1.106,46	1.106,46	R\$ -
3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	409,21	0,99	0,00	0,99	0,99	-	405,11	405,11	405,11	R\$ -
3.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	272,28	0,99	0,00	0,99	0,99	-	269,55	269,55	269,55	R\$ -
									2.999,53	2.999,53	2.999,53	
3.2	VIGAS SUPERIORES											R\$ 660,41
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	51,89	4,43	0,00	4,43	4,43	-	229,87	229,87	229,87	R\$ -
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,55	3,68	0,00	3,68	3,68	-	71,94	71,94	71,94	R\$ -
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,83	10,78	0,00	10,78	10,78	-	181,42	181,42	181,42	R\$ -
3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	409,21	0,26	0,00	0,26	0,26	-	106,39	106,39	106,39	R\$ -
3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	272,28	0,26	0,00	0,26	0,26	-	70,79	70,79	70,79	R\$ -
									660,41	660,41	660,41	
3.3	LAJE											R\$ 522,90
3.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	162,90	3,21	0,00	3,21	3,21	-	522,90	522,90	522,90	R\$ -
									522,90	522,90	522,90	
4	ELEVAÇÃO											R\$ 2.835,24

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PA Nº 1619551413

4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	155,38	19,96	0,00	19,96	19,96	-	2.635,24	2.635,24	2.635,24	R\$ -
									2.635,24	2.635,24	2.635,24	
5	ESQUADRIAS											R\$ 8.901,55
5.1	COBORGÓ											R\$ 108,93
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	161,65	0,56	0,00	0,56	0,56	-	108,93	108,93	108,93	R\$ -
									108,93	108,93	108,93	
6.2	JANELAS											R\$ 2.089,35
5.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	696,45	3,00	0,00	3,00	3,00	-	2.089,35	2.089,35	2.089,35	R\$ -
									2.089,35	2.089,35	2.089,35	
5.3	PORTAS											R\$ 6.703,27
5.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	957,61	7,00	0,00	7,00	7,00	-	6.703,27	6.703,27	6.703,27	R\$ -
									6.703,27	6.703,27	6.703,27	
6	REVESTIMENTO											R\$ 4.437,52
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3,69	33,92	0,00	33,92	33,92	-	125,16	125,16	125,16	
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	31,60	13,64	0,00	13,64	13,64	-	431,02	431,02	431,02	
6.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	26,75	11,71	0,00	11,71	11,71	-	313,24	313,24	313,24	
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	61,15	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35	3.568,10	0,00	0,00	
									4.437,52	869,42	869,42	
7	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 9.132,81
7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	26,88	58,19	0,00	0,00	0,00	58,19	1.564,14	0,00	0,00	R\$ 1.564,14
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	26,78	51,82	0,00	0,00	0,00	51,82	1.387,73	0,00	0,00	R\$ 1.387,73
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	52,31	118,16	0,00	0,00	0,00	118,16	6.180,94	0,00	0,00	R\$ 6.180,94
									9.132,81	0,00	0,00	
8	PINTURA											R\$ 64.846,36
8.1	PAREDES											R\$ 55.575,48
8.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,50	2097,98	0,00	0,00	0,00	2.097,98	5.244,95	0,00	0,00	R\$ 5.244,95
8.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,61	2097,98	0,00	0,00	0,00	2.097,98	22.259,56	0,00	0,00	R\$ 22.259,56
8.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,38	2097,98	0,00	0,00	0,00	2.097,98	28.070,97	0,00	0,00	R\$ 28.070,97

Análise de Custos
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 161965144

									55.575,48	0,00	0,00	
8.2	TETO											R\$ 9.270,88
8.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2,91	509,67	0,00	0,00	0,00	509,67	1.483,13	0,00	0,00	R\$ 1.483,13
8.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,28	509,67	0,00	0,00	0,00	509,67	7.787,75	0,00	0,00	R\$ 7.787,75
									9.270,88	0,00	0,00	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ 14.156,04
9.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,39	8,00	0,00	8,00	8,00	-	195,12	195,12	195,12	R\$ -
9.2	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,81	1,00	0,00	1,00	1,00	-	52,81	52,81	52,81	R\$ -
9.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,88	1,00	0,00	1,00	1,00	-	27,88	27,88	27,88	R\$ -
9.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,11	1,00	0,00	1,00	1,00	-	29,11	29,11	29,11	R\$ -
9.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,99	19,00	0,00	19,00	19,00	-	911,81	911,81	911,81	R\$ -
9.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,31	14,00	0,00	14,00	14,00	-	578,34	578,34	578,34	R\$ -
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,39	4,00	0,00	4,00	4,00	-	41,56	41,56	41,56	R\$ -
9.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,96	4,00	0,00	4,00	4,00	-	43,84	43,84	43,84	R\$ -
9.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,89	1345,20	0,00	1345,20	1345,20	-	5.232,82	5.232,82	5.232,82	R\$ -
9.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,70	267,80	0,00	267,80	267,80	-	2.329,86	2.329,86	2.329,86	R\$ -
9.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,75	12,00	0,00	12,00	12,00	-	69,00	69,00	69,00	R\$ -
9.12	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,62	17,00	0,00	17,00	17,00	-	163,54	163,54	163,54	R\$ -
9.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,84	44,00	0,00	44,00	44,00	-	388,96	388,96	388,96	R\$ -
9.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	580,67	1,00	0,00	1,00	1,00	-	580,67	580,67	580,67	R\$ -
9.15	LUMINÁRIA TIPO PAFON, COM 1 LAMPADA DE LED 50 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	81,80	5,00	0,00	5,00	5,00	-	409,00	409,00	409,00	R\$ -
9.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	67,88	3,00	0,00	3,00	3,00	-	203,64	203,64	203,64	R\$ -
9.17	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE LED 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	61,16	9,00	0,00	9,00	9,00	-	550,44	550,44	550,44	R\$ -
9.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,81	50,10	0,00	50,10	50,10	-	591,68	591,68	591,68	R\$ -
9.19	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	29,47	41,00	0,00	41,00	41,00	-	1.208,27	1.208,27	1.208,27	R\$ -
9.20	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	35,11	4,00	0,00	4,00	4,00	-	140,44	140,44	140,44	R\$ -
9.21	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	0,06	47,00	0,00	47,00	47,00	-	2,82	2,82	2,82	R\$ -
9.22	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75* MM	UN	33,97	9,00	0,00	9,00	9,00	-	305,73	305,73	305,73	R\$ -
9.23	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	2,10	47,00	0,00	47,00	47,00	-	98,70	98,70	98,70	R\$ -

									14.156,04	14.156,04	14.156,04	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											R\$ 12.155,30
10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,45	41,46	0,00	0,00	0,00	41,46	889,31	0,00	0,00	R\$ 889,31
10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,98	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89	57,74	0,00	0,00	R\$ 57,74
10.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,34	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	38,04	0,00	0,00	R\$ 38,04
10.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,66	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	46,64	0,00	0,00	R\$ 46,64
10.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,19	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	30,38	0,00	0,00	R\$ 30,38
10.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,63	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,63	0,00	0,00	R\$ 16,63
10.7	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,29	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	131,22	0,00	0,00	R\$ 131,22
10.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,99	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	77,97	0,00	0,00	R\$ 77,97
10.9	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,85	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8,55	0,00	0,00	R\$ 8,55
									12.155,30	0,00	0,00	
10.10	LOUÇAS E METAIS											R\$ 4.579,66
10.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	472,03	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.416,09	0,00	0,00	R\$ 1.416,09
10.10.2	LAVATÓRIO COM BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO, E= 3CM, DIM 1,50X0,60 COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODABANCADA 7CM, ASSENTADA	UND	1.724,07	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.724,07	0,00	0,00	R\$ 1.724,07
10.10.3	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	880,10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	880,10	0,00	0,00	R\$ 880,10
10.10.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	279,70	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	559,40	0,00	0,00	R\$ 559,40
									4.579,66	0,00	0,00	
10.11	ACESSÓRIOS											R\$ 6.279,16
10.11.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	89,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	267,00	0,00	0,00	R\$ 267,00
10.11.2	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 1.1/2" (40 MM)	UN	3,77	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	11,31	0,00	0,00	R\$ 11,31
10.11.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	6.000,85	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.000,85	0,00	0,00	R\$ 6.000,85
									6.279,16	0,00	0,00	
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA											R\$ 16.046,14
11.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,25	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,50	0,00	0,00	R\$ 20,50
11.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,42	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	115,26	0,00	0,00	R\$ 115,26
11.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	86,41	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	86,41	0,00	0,00	R\$ 86,41

11.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	23,81	0,00	0,00	R\$ 23,81	
11.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,87	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	47,74	0,00	0,00	R\$ 47,74	
11.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	45,57	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,57	0,00	0,00	R\$ 45,57	
11.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19,26	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	33,51	0,00	0,00	R\$ 33,51	
11.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,32	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	99,68	0,00	0,00	R\$ 99,68	
11.9	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	11,82	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	23,64	0,00	0,00	R\$ 23,64	
11.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,20	30,46	0,00	0,00	0,00	30,46	1.650,93	0,00	0,00	R\$ 1.650,93	
11.11	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	17,25	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17,25	0,00	0,00	R\$ 17,25	
									2.164,30	0,00	0,00		
11.12	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS												R\$ 367,36
11.12.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,77	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,77	0,00	0,00	R\$ 33,77	
11.12.2	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	333,59	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	333,59	0,00	0,00	R\$ 333,59	
									367,36	0,00	0,00		
11.13	VENTILAÇÃO												R\$ 124,89
11.13.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	27,00	0,00	0,00	R\$ 27,00	
11.13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	20,38	4,21	0,00	0,00	0,00	4,21	85,79	0,00	0,00	R\$ 85,79	
11.13.3	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	12,10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,10	0,00	0,00	R\$ 12,10	
									124,89	0,00	0,00		
11.14	VENTILAÇÃO												R\$ 13.389,59
11.14.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m³	85,82	23,40	0,00	23,40	23,40	-	2.008,18	2.008,18	2.008,18	R\$ -	
11.14.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,86	5,09	0,00	5,09	5,09	-	14,55	14,55	14,55	R\$ -	
11.14.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	86,57	16,96	0,00	16,96	16,96	-	1.468,22	1.468,22	1.468,22	R\$ -	
11.14.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,12	36,56	0,00	36,56	36,56	-	662,46	662,46	662,46	R\$ -	
11.14.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,30	83,69	0,00	83,69	83,69	-	1.196,76	1.196,76	1.196,76	R\$ -	
11.14.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	150,12	43,18	0,00	43,18	43,18	-	6.482,18	6.482,18	6.482,18	R\$ -	

11.14.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	162,90	2,54	0,00	2,54	2,54	-	413,76	413,76	413,76	R\$	-
11.14.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	409,21	1,27	0,00	1,27	1,27	-	519,69	519,69	519,69	R\$	-
11.14.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	272,28	1,27	0,00	1,27	1,27	-	345,79	345,79	345,79	R\$	-
11.14.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m²	130,84	1,53	0,00	1,53	1,53	-	200,18	200,18	200,18	R\$	-
11.14.11	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SÉPTICA	UND	38,91	2,00	0,00	2,00	2,00	-	77,82	77,82	77,82	R\$	-
									13.389,69	13.389,69	13.389,69		
12	COBERTURA/FORRO											R\$	29.863,34
12.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1.562,72	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.125,44	0,00	0,00	R\$	3.125,44
12.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	34,50	51,82	0,00	0,00	0,00	51,82	1.787,79	0,00	0,00	R\$	1.787,79
12.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	62,44	51,82	0,00	0,00	0,00	51,82	3.235,64	0,00	0,00	R\$	3.235,64
12.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	35,54	416,66	0,00	416,66	416,66	-	14.808,09	14.808,09	14.808,09	R\$	-
12.5	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	65,42	105,57	0,00	105,57	105,57	-	6.906,38	6.906,38	6.906,38	R\$	-
									29.863,34	21.714,47	21.714,47		
	TOTAL COM BDI INCLUSO								R\$ 174.292,18	R\$ 72.448,37	R\$ 72.448,37		

Soré F. Veloso
Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB 01/2019 10.000.000-0

Lúcio Flavio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

20/12/2022 a 10/03/2023

CONSTRUTORA: MD2 ENGENHARIA EIRELI

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO

TOMADA DE PREÇO: TP 007/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 0012/2022



FOTO 01 - REVISÃO DE COBERTA

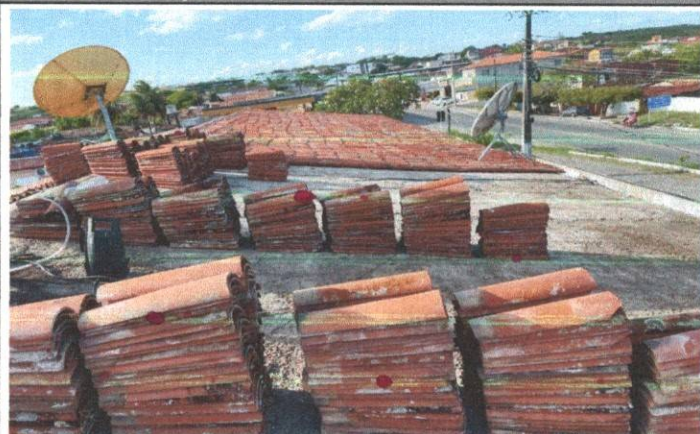


FOTO 02 - REVISÃO DE COBERTA

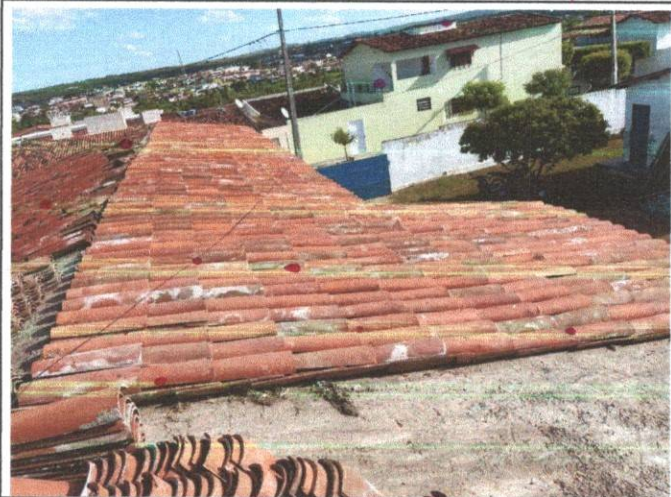


FOTO 03 - REVISÃO DE COBERTA

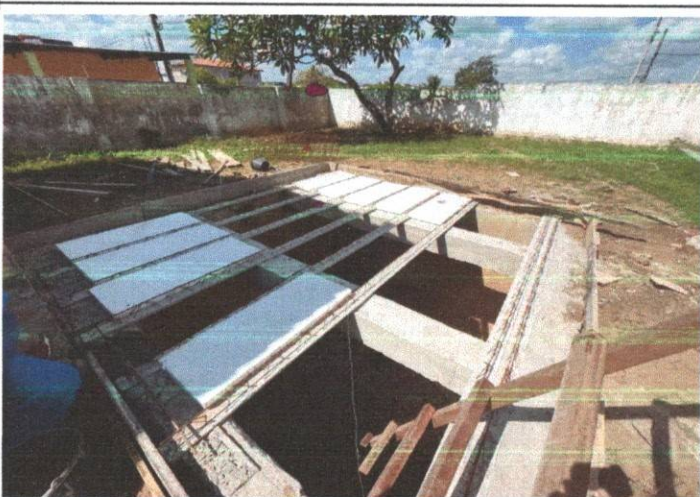


FOTO 04 - SUMIDOURO



FOTO 05 - FORRO DE GESSO

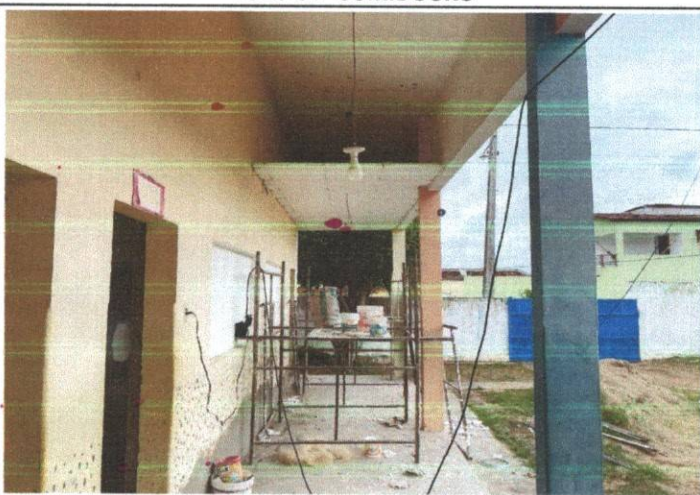


FOTO 06 - CORREDOR

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA/PB Nº 1619551446

SDA

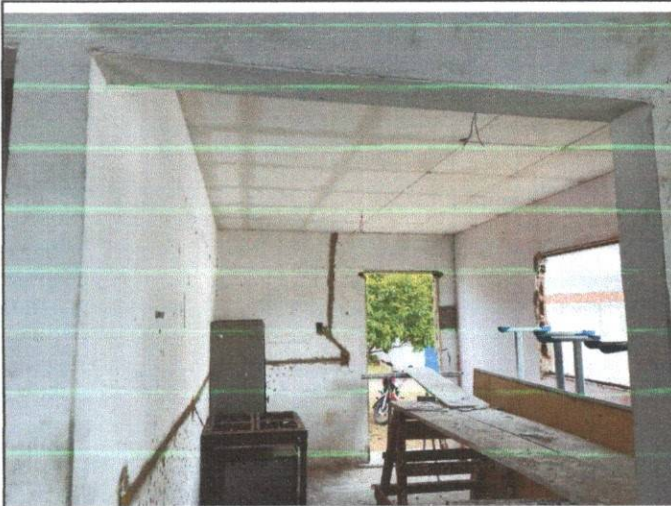


FOTO 07 - SALA



FOTO 08 - SALA



FOTO 09 - SALA



FOTO 10 - DEMOLIÇÃO

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA/PA 1619551446

Data da consulta: 11/01/2023 00:56:16

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.484.295/0001-99**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MD2 ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual


Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/02/2023 14h52min

Data de Validade: 09/03/2023

Nº da Certidão: 01373742/2023

Nº da Autenticidade: PD.41.PT.E4.AL

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: MD2 ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 21.484.295/0001-99

Endereço Residencial: FAZ BOA VISTA, 178

Bairro: ZONA RURAL

Inscrição Estadual:

Compl:

Cidade: São Vicente Ferrer/PE


Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 07/02/2023 14h55min

Data de Validade: 09/03/2023

Nº da Certidão: 01373748/2023

Nº da Autenticidade: F8.22.Q6.GL.V7

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: MD2 ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 21.484.295/0001-99

Endereço Residencial: FAZ BOA VISTA, 178

Bairro: ZONA RURAL

Inscrição Estadual:

Compl:

Cidade: São Vicente Ferrer/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fôco.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MD2 ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.484.295/0001-99

Certidão n°: 35363878/2022

Expedição: 19/10/2022, às 01:38:23

Validade: 17/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MD2 ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.484.295/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MD2 ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 21.484.295/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:23:21 do dia 23/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2023.

Código de controle da certidão: **E121.12EC.1402.851F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 21.484.295/0001-99
Razão Social: MD2 ENGENHARIA EIRELI
Endereço: FAZ BOA VISTA 178 / ZONA RURAL / SAO VICENTE FERRER / PE / 55860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022202552100734052

Informação obtida em 06/03/2023 12:58:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rodovia PE-89 N° S/N - Centro, CEP 55860-000 - São Vicente Férrer - PE
TEL.: (81)3655-1223 CNPJ: 11.361.896/0001-50



Número da Nota:

00000019

Competência:

MAR/2023

Data e Hora Emissão:

10/03/2023 14:00:37

Código de Verificação:

JKHL-ATJB8

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

ITABAIANA - PB

Local da Prestação:

ITABAIANA - PB

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ:

21.484.295/0001-99

Inscrição Municipal:

886

Nome/Razão Social:

MD2 ENGENHARIA EIRELI

Endereço:

FAZ BOA VISTA ,ZONA RURAL. 178

Município:

UF: **PE**

CEP: **0**

E-mail:

md2engenhariaeconstrucoes@gmail.com

TEL: **8198349799**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

09.072.430/0001-93

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA PB

Endereço:

AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422/430 CENTRO

Município:

ITABAIANA

UF: **PB**

CEP: **58360000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO #QTD:1 - V.UND.:R\$72.448,37 - TOTAL.:R\$72.448,37 - DED.:R\$43.469,02

CONTRATO 00182/2022

TOMADA DE PREÇO 007/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220818TP00007

60% MATERIAIS - R\$43.469,02 40% MAO DE OBRA - R\$28.979,35

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.448,37

Atividade Prestada:

4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
72.448,37	43.469,02	28.979,35	2,01%	582,48
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 700/2001 de 28 de dezembro de 2001.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

510508157758491

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saovicenteferrer/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria de Tributos e Renda

Endereço: RODOVIA PE-89, S/N-CENTRO Telefone: (81)3655-1223 CNPJ: 11.361.896/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 24/02/2023

Contribuinte: MD2 ENGENHARIA EIRELI		Inscrição Mercantil: 886 Sequencial:
Localização: FAZ BOA VISTA, 178, , ZONA RURAL		Referência Loteamento:
Natureza: Tributos Mercantis		Cadastro Imobiliário:
Razão Social: MD2 ENGENHARIA EIRELI		Inscrição Imobiliária:
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
21.484.295/0001-99		886
Atividade Principal:		
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias		
2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS		
2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS		
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES		
Início Atividade:	26/01/2021	Validade: 25/04/2023
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

osmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saovicenteferrer/iviews/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

A3747C1976B29F9C0052B48C8F242DEB114FFE87

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000429888-21

Data de Emissão: 16/01/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 21.484.295/0001-99

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **15/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



ESTADO DE PERNAMBUCO
PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MACAPARANA
(Setor de Distribuição Cível e Criminal e Protocolo)

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

CERTIFICO, por me haver sido pedido verbalmente que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CÍVEL** no período de **05 (cinco)** anos até 02 de junho de 2016, quando foi implantado o PJE para os processos cíveis, **não encontrei DISTRIBUIDA nenhuma Ação de Falência/Concordata em face da MD2 ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n.º 21.484.295/0001-99.**

CERTIFICO, ainda, que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de Pernambuco, diretamente no site www.tjpe.jus.br **ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.**

Macaparana, 27 de fevereiro de 2023.

RODRIGO
MOURA FELIX DA
SILVA:1792717
Rodrigo Moura Felix da Silva
Distribuidor

Assinado de forma digital
por RODRIGO MOURA FELIX
DA SILVA:1792717
Dados: 2023.02.27 08:12:11
+03'00"

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016
