



ESTADO DA PARAÍBA
ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC
BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM 01

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)

R\$9.626,77

Unidade Administrativa: Secretária de Educação			Contrato:		0001/2022									
Medição:	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01		Ordem de Serviço:		0001/2022		Prazo da Obra:					18 dias		
Obra:	REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC EM ITABAIANA-PB						Prazo decorrido:					15 dias		
Serviço Medido: PINTURA, REVESTIMENTO E FORRO							Valor Acumulado das Medições:					R\$9.626,77		
Firma:	EXECUTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA		Período:		03/11/2022 18/11/2022		SALDO:						-R\$0,52	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.				SALDO	Preço Unitário	VALORES (R\$)					
			Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total			Contratado	Soma Med.Ant.	No período	TOTAL	SALDO	
1.0	PINTURA								-		R\$ 7.274,18	R\$ 7.274,18	R\$ 0,00	
1.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	443,07	-	443,07	443,07	0,00	16,42	7274,18		R\$ 7.274,18	R\$ 7.274,18	R\$ 0,00	
2.0	REVESTIMENTO								-		R\$ 1.646,44	R\$ 1.646,44	-R\$ 0,33	
2.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m²	15,21	-	15,21	15,21	0,00	99,65	1515,74		R\$ 1.516,07	R\$ 1.516,07	-R\$ 0,33	
2.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. af_06/2014	m	16,25	-	16,25	16,25	0,00	8,02	130,37		R\$ 130,37	R\$ 130,37	R\$ -	
3.0	FORRO								-		R\$ 706,15	R\$ 706,15	-R\$ 0,18	
3.1	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m²	15,21	-	15,21	15,21	0,00	46,41	705,97		R\$ 706,15	R\$ 706,15	-R\$ 0,18	
TOTAL GERAL									-		R\$9.626,77	R\$9.626,77	-R\$0,52	

Fabio Henrique de S. B. B. B. B.
Representante da Empresa Contratada

Jose Ribamar Campos Cavalcante
CPF: 131.95634-53
Engenheiro Civil

Maria das Graças Pereira
GESTORA ESCOLAR DO CAIC



ESTADO DA PARAÍBA
ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC
BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM 01

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)

R\$9.626,77

Unidade Administrativa: Secretária de Educação		Contrato: 0001/2022		Prazo da Obra:		18 dias								
Medição:	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01		Ordem de Serviço: 0001/2022		Prazo decorrido:		15 dias							
Obra:	REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC EM ITABAIANA-PB				Valor Acumulado das Medições:		R\$9.626,77							
Serviço Medido: PINTURA, REVESTIMENTO E FORRO		Período: 03/11/2022 18/11/2022		SALDO:		R\$0,52								
Firma: EXECUTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA		QUANT.		Preço Unitário		VALORES (R\$)								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total	SALDO	Contratado	Soma Med. Ant.	No período	TOTAL	SALDO		
								-		R\$ 7.274,18	R\$ 7.274,18	R\$ 0,00		
1.0	PINTURA													
1.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	443,07	-	443,07	443,07	0,00	16,42	7274,18	R\$ 7.274,18	R\$ 7.274,18	R\$ 0,00		
2.0	REVESTIMENTO									R\$ 1.646,44	R\$ 1.646,44	-R\$ 0,33		
2.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m²	15,21	-	15,21	15,21	0,00	99,65	1515,74	R\$ 1.516,07	R\$ 1.516,07	-R\$ 0,33		
2.2	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. af_06/2014	m	16,25	-	16,25	16,25	0,00	8,02	130,37	R\$ 130,37	R\$ 130,37	R\$ 0,00		
3.0	FORRO									R\$ 706,15	R\$ 706,15	-R\$ 0,18		
3.1	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m²	15,21	-	15,21	15,21	0,00	46,41	705,97	R\$ 706,15	R\$ 706,15	-R\$ 0,18		
TOTAL GERAL												R\$9.626,77	R\$9.626,77	-R\$0,52

Felipe Henrique da Silva Barbosa
Representante da Empresa Contratada

José Raimundo Campos Cavalcante
CPF: 121.495634-63
Engenheiro Civil

Maria das Graças Pereira
Gestora Escolar do Caic



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma da Escola Sebastião Rodrigues de Melo - CAIC
CONTRATADA:	EXECUTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA
PERÍODO:	03/11/2022 até 18/11/2022

BM01

1.0 PINTURA

1.1 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

	Área
Paredes internas	$(90 \times 2,1) + ((6,20 + 7,4 + 6,20 + 7,4) \times 2,52) \times 3 + ((6,2 + 6,2 + 2,45 + 2,45) \times 2,8)$ m²
Total =	443,07 m²


2.0 REVESTIMENTO

2.1 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014

	Área
Área de uma sala	6,21x2,45 m²
Total =	15,21 m²

3.1 - Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. af_06/2014

	Perímetro
Perímetro da mesma sala q foi realizado o revestimento do piso	$(6,20 + 6,20 + 2,45 + 1,40)$ m
Total =	16,25 m


José Ribamar Campos Cavalcanti
CPF: 131.495634-53
Engenheiro Civil



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

QUANTITATIVOS

OBRA:	Reforma da Escola Sebastião Rodrigues de Melo - CAIC
CONTRATADA:	EXECUTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA
PERÍODO:	03/11/2022 até 18/11/2022

BM01

1.0 PINTURA

1.1 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

	Área
Paredes internas	$(90 \times 2,1) + ((6,20 + 7,4 + 6,20 + 7,4) \times 2,52) \times 3 + ((6,2 + 6,2 + 2,45 + 2,45) \times 2,8)$ m²
Total =	443,07 m²


2.0 REVESTIMENTO

2.1 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014

	Área
Área de uma sala	6,21x2,45 m²
Total =	15,21 m²

3.1 - Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. af_06/2014

	Perímetro
Perímetro da mesma sala q foi realizado o revestimento do piso	$(6,20 + 6,20 + 2,45 + 1,40)$ m
Total =	16,25 m


José Ribamar Campos Cavalcanti
CPF: 131.495634-99
Engenheiro Civil



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

Período: 03/11/2022 até 18/11/2022

CONSTRUTORA: EXECUTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA

OBRA: Reforma da Escola Sebastião Rodrigues de Melo - CAIC

CONTRATO: 0001/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 0001/2022

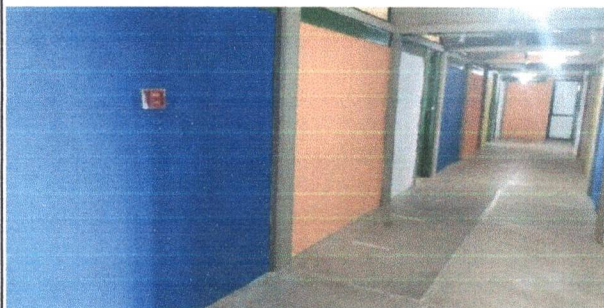


FOTO 01 Execução de Pintura Interna



FOTO 02 Execução de Pintura Interna



FOTO 03 Execução de Pintura Interna

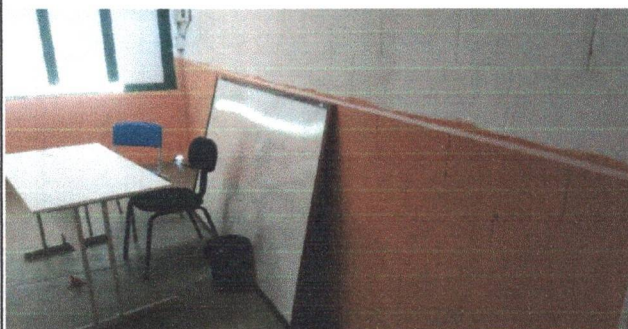


FOTO 04 Execução de Pintura Interna



FOTO 05 Execução de Pintura Interna

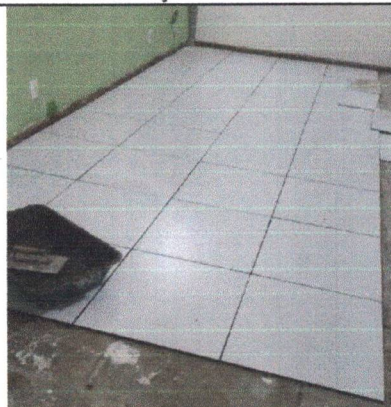


FOTO 06 Execução Revestimento do Piso



ter



FOTO 05 Execução de Forro de Gesso



FOTO 06 Execução de Forro de Gesso

ter



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

Período: 03/11/2022 até 18/11/2022

CONSTRUTORA: EXECUTE CONSTRUTORA E ENGENHARIA

OBRA: Reforma da Escola Sebastião Rodrigues de Melo - CAIC

CONTRATO: 0001/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 0001/2022



FOTO 01 Execução de Pintura Interna



FOTO 02 Execução de Pintura Interna



FOTO 03 Execução de Pintura Interna

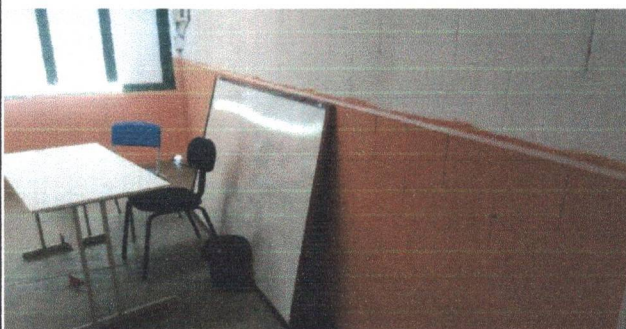


FOTO 04 Execução de Pintura Interna



FOTO 05 Execução de Pintura Interna



FOTO 06 Execução Revestimento do Piso



ten

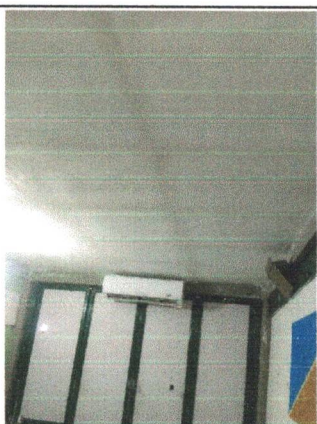


FOTO 05 Execução de Forro de Gesso



FOTO 06 Execução de Forro de Gesso

ten
