

 ITABAIANA GOVERNO MUNICIPAL				ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 01				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 31.968,30			
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço:		OS 0008/2023				07/06/2023					
Medição: BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				Pregão Presencial:		PP 000017/2022						Prazo da Obra:		90 dias	
Obra: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO												Prazo decorrido:		62 dias	
Serviços Medidos: Serv. Preliminares; Pavimentação.												Valor do contrato:		R\$90.161,82	
												Valor Acumulado das Medições:		R\$0,00	
Firma: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Período:		08/06/2023		08/08/2023				Saldo do Contrato:		R\$90.161,82	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO			
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total				
01 - RUA JOSÉ PAULO DE LUCENA															
1	TERRAPLANAGEM														R\$16.504,69
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	288,60	0,00	123,60	123,60	165,00	16.504,69	7.068,68	7.068,68	R\$ 9.436,01			
									16.504,69	7.068,68	7.068,68				
2	PAVIMENTAÇÃO														R\$73.657,13
2.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.AF_12/2020	m²	73,78	660,85	0,00	0,00	0,00	660,85	48.757,51	0,00	0,00	R\$ 48.757,51			
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	301,19	0,00	301,19	301,19	-	24.899,62	24.899,62	24.899,62	R\$ -			
									73.657,13	24.899,62	24.899,62				
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 90.161,82	R\$ 31.968,30	R\$ 31.968,30				

Pedro de O. Catão Bongiovi
Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 161.965.148

Lúcio Flávio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

QUANTITATIVOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO		BM 01
CONTRATADA:	CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		
PERÍODO:	08/06/2023	a 08/08/2023	

1 TERRAPLANAGEM

1.1. Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

	VOLUME
TERRAPLANAGEM	123,60 M3

TOTAL MEDIDO	123,60	M3
--------------	--------	----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M3
MEDIÇÃO ATUAL	123,60	M3
TOTAL ACUMULADO	123,60	M3

2 PAVIMENTAÇÃO

2.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	301,19 M2

TOTAL MEDIDO	301,19	M2
--------------	--------	----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M2
MEDIÇÃO ATUAL	301,19	M2
TOTAL ACUMULADO	301,19	M2

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 4619557446

Rodrigo do Carmo



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

08/06/2023 A 08/08/2023

CONSTRUTORA: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO

PREGÃO PRESENCIAL: PP 000017/2022

ORDEM DE SERVIÇO: 0008/2022

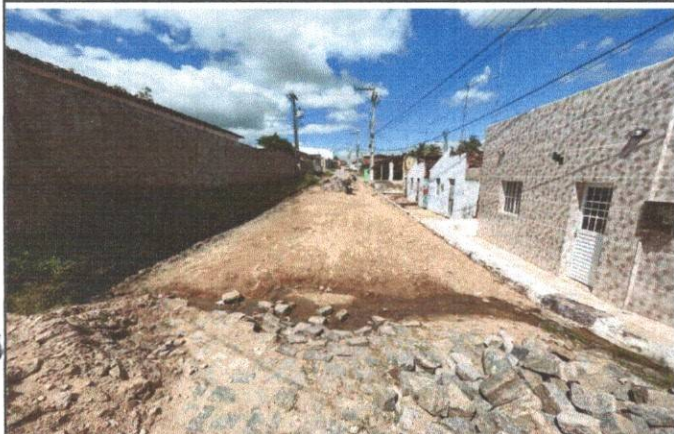


FOTO 01 - RUA JOSÉ PAULO DE LUCENA



FOTO 02 - RUA JOSÉ PAULO DE LUCENA

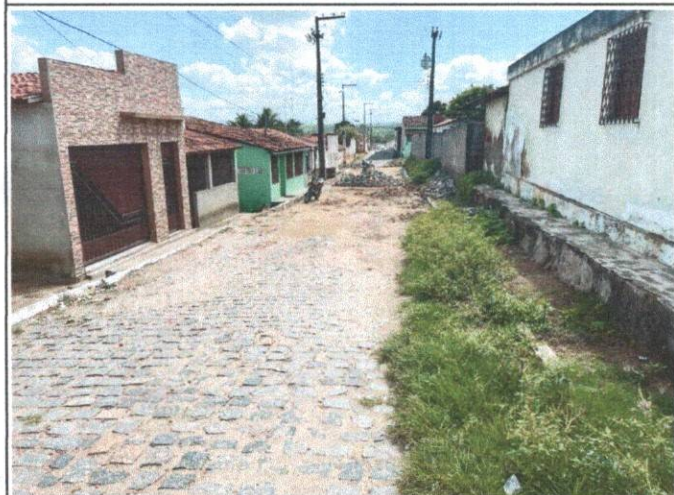


FOTO 03 - RUA JOSÉ PAULO DE LUCENA



FOTO 04 - RUA JOSÉ PAULO DE LUCENA

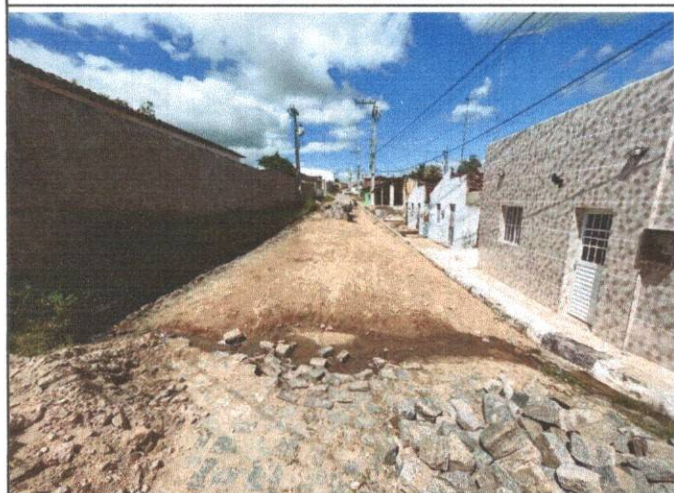


FOTO 05 - RUA JOSÉ PAULO DE LUCENA



FOTO 06 - RUA JOSÉ PAULO DE LUCENA

Rodrigo do O' Zélio Ruyson
 [Signature]

..nália Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA-PB 1619551446

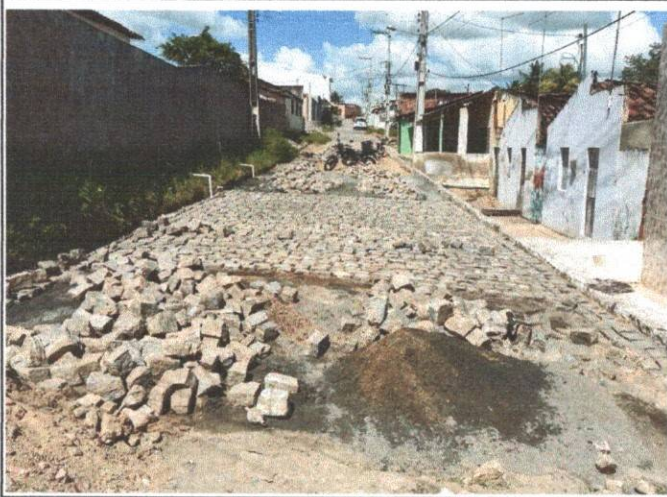


FOTO 07 - RUA JOSÉ PAULO DE LUCENA

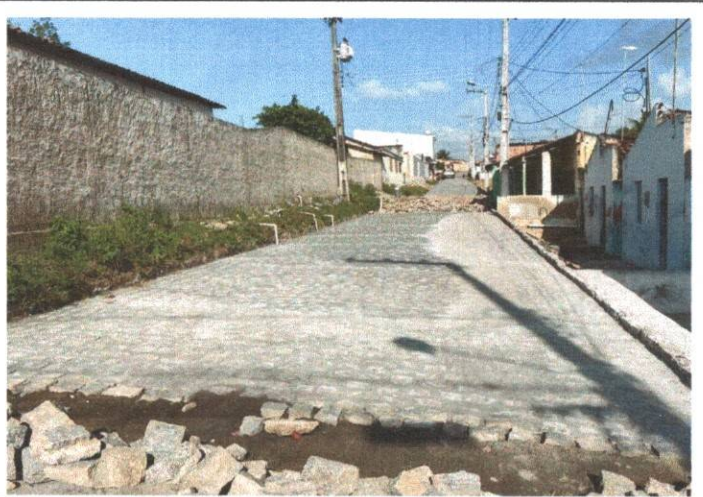


FOTO 08 - RUA JOSÉ PAULO DE LUCENA

Rodrigo do O. Carlos Borges
R

Analía Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
REA-PB 1619551448
