


 ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 02				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)					
				50.892,44									
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço:		OS 008/2023		14/06/2023					
Medição: Boletim de Medição Nº 02				Pregão de Presencial:		PP 00025/2023				Prazo da Obra:		90 dias	
Obra: RECUPERAÇÃO DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES										Prazo decorrido:		36 dias	
Serviços Medidos: Cobertura; Forro; Revestimento; Pavimentação; Pintura.										Valor do contrato:		R\$115.172,58	
										Valor Acumulado das Medições:		R\$108.181,08	
Firma: COSNTRUTORA EXECUTE LTDA				Período:		29/06/2023		20/07/2023		Saldo do Contrato:		R\$6.991,50	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO	
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$ 3.668,00
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	458,50	8,00	8,00	0,00	8,00	-	3.668,00	0,00	3.668,00	R\$	-
									3.668,00	0,00	3.668,00		
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES												R\$ 9.599,27
2.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	4,43	23,15	23,15	0,00	23,15	-	102,55	0,00	0,00	R\$	-
2.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	7,73	1.144,59	1.144,59	0,00	1.144,59	-	8.841,96	0,00	8.841,96	R\$	-
2.3	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	15,23	16,16	16,16	0,00	16,16	-	246,04	0,00	246,04	R\$	-
2.4	Demolição de reboco	m²	9,61	42,52	42,52	0,00	42,52	-	408,72	0,00	408,72	R\$	-
									9.599,27	0,00	9.496,72		
3	ELEVAÇÃO												R\$ 647,47
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	56,40	11,48	11,48	0,00	11,48	-	647,47	0,00	647,47	R\$	-
									647,47	0,00	647,47		
4	COBERTURA												R\$ 44.940,20
4.1	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	86,98	412,50	206,25	206,25	412,50	-	35.879,25	17.939,62	35.879,25	R\$	-
4.2	Lona plástica preta	m²	6,46	412,50	206,25	206,25	412,50	-	2.664,75	1.332,37	2.664,75	R\$	-
4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	70,03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	5.602,40	0,00	0,00	R\$	5.602,40
4.4	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	39,69	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	793,80	0,00	0,00	R\$	793,80
									44.940,20	19.271,99	38.544,00		
5	FORRO												R\$ 898,91
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	38,83	23,15	0,00	23,15	23,15	-	898,91	898,91	898,91	R\$	-
									898,91	898,91	898,91		
6	REVESTIMENTO												R\$ 14.364,32
6.1	PAREDE												R\$ 14.364,32
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	4,24	42,52	42,52	0,00	42,52	-	180,28	0,00	180,28	R\$	0,00
6.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	31,56	42,52	42,52	0,00	42,52	-	1.341,93	0,00	1.341,93	R\$	0,00
6.1.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af 06/2014	m²	80,54	159,45	59,45	100,00	159,45	-	12.842,10	8.054,00	12.842,10	R\$	0,00

Fábio



									14.364,32	8.064,00	14.364,32	
7	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 5.223,10
7.1	INTERNO											R\$ 5.223,10
7.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	61,03	84,00	0,00	84,00	84,00	-	5.126,52	5.126,52	5.126,52	R\$ -
7.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	48,29	2,00	0,00	2,00	2,00	-	96,58	96,58	96,58	R\$ -
									5.223,10	5.223,10	5.223,10	
8	ESQUADRIAS											R\$ 1.261,14
8.1	PORTAS											R\$ 1.261,14
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1.155,71	1,00	1,00	0,00	1,00	-	1.155,71	0,00	1.155,71	R\$ -
8.1.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	105,43	1,00	1,00	0,00	1,00	-	105,43	0,00	105,43	R\$ -
									1.261,14	0,00	1.261,14	
9	PINTURA											R\$ 34.570,16
9.1	PAREDES											R\$ 25.984,01
9.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	3,18	1144,59	572,29	572,29	1144,58	0,01	3.639,80	1.819,88	3.639,76	R\$ -
9.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	15,54	444,99	222,49	222,49	444,98	0,01	6.915,14	3.457,49	6.914,99	R\$ -
9.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	13,48	1144,59	572,29	572,29	1144,58	0,01	15.429,07	7.714,47	15.428,94	R\$ -
									25.984,01	12.991,85	25.984,01	
9.2	TETO											R\$ 7.281,99
9.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3,59	384,68	192,34	192,34	384,68	-	1.381,00	690,50	1.381,00	R\$ 0,00
9.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	15,34	384,68	192,34	192,34	384,68	-	5.900,99	2.950,50	5.900,99	R\$ 0,00
									7.281,99	3.641,00	7.281,99	
9.3	ESQUADRIAS											R\$ 1.304,16
9.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	15,09	36,96	0,00	36,96	36,96	-	557,73	557,73	557,73	R\$ 0,00
9.3.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af 01/2020	m²	46,19	16,16	0,00	16,16	16,16	-	746,43	746,43	746,43	R\$ 0,00
									1.304,16	1.304,16	1.304,16	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 115.172,58	R\$ 50.892,44	R\$ 108.673,83	

Fabio Henrique de Siles Barbosa
Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

Lúcio Flavio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

29/06/2023 À 20/07/2023

CONSTRUTORA: COSNTRUTORA EXECUTE LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES

PREGÃO PRESENCIAL: PP 0025/2023

ORDEM DE SERVIÇO: 008/2023



FOTO 01 - INTERTRAVADO



FOTO 02 - REVESTIMENTO CERÂMICO

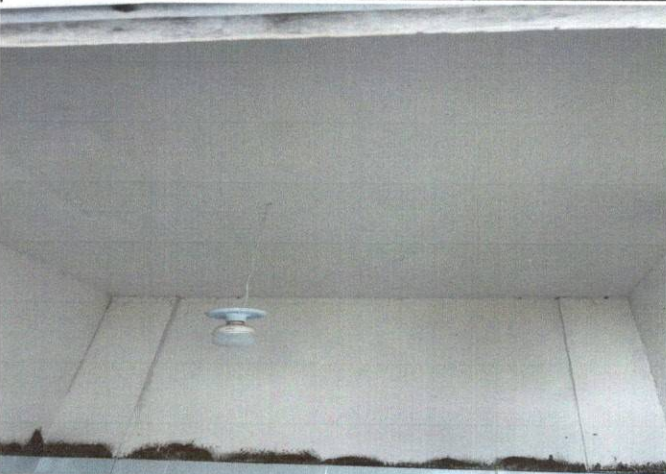


FOTO 03 - FORRO DE GESSO

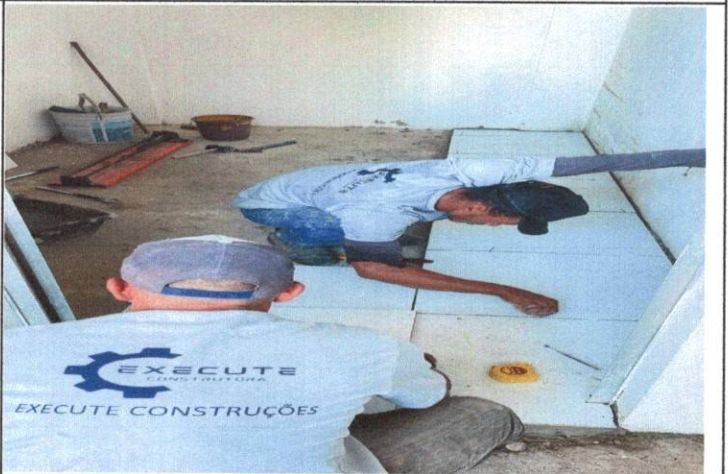


FOTO 04 - REVESTIMENTO CERÂMICO

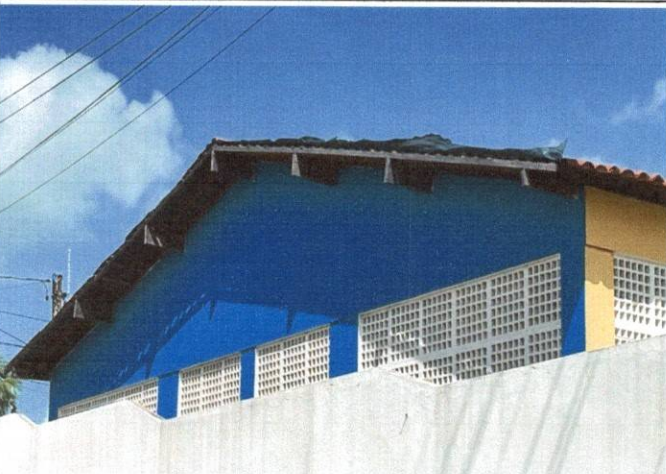


FOTO 05 - LONA PLÁSTICA



FOTO 06 - LONA PLÁSTICA

Fabio



FOTO 07 - PINTURA ESQUADRIA DE MADEIRA



FOTO 08 - PINTURA ESQUADRIA METÁLICA



FOTO 07 - PINTURA ALVENARIA



FOTO 08 - PINTURA ALVENARIA

Fábio

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.
