

 ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 03				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 6.991,50				
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço: OS 008/2023				14/06/2023				
Medição: Boletim de Medição Nº 03 (FINAL)				Pregão de Presencial: PP 00025/2023								
Obra: RECUPERAÇÃO DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES								Prazo da Obra: 90 dias				
Serviços Medidos: Cobertura.								Prazo decorrido: 75 dias				
								Valor do contrato: R\$115.172,58				
								Valor Acumulado das Medições: R\$115.172,58				
Firma: COSNTRUTORA EXECUTE LTDA				Período: 21/07/2023 28/08/2023				Saldo do Contrato: R\$0,00				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 3.668,00
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	458,50	8,00	8,00	0,00	8,00	-	3.668,00	0,00	3.668,00	R\$ -
									3.668,00	0,00	3.668,00	
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES											R\$ 9.599,27
2.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,43	23,15	23,15	0,00	23,15	-	102,55	0,00	0,00	R\$ -
2.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	7,73	1.144,59	1.144,59	0,00	1.144,59	-	8.841,96	0,00	8.841,96	R\$ -
2.3	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	15,23	16,16	16,16	0,00	16,16	-	246,04	0,00	246,04	R\$ -
2.4	Demolição de reboco	m²	9,61	42,52	42,52	0,00	42,52	-	408,72	0,00	408,72	R\$ -
									9.599,27	0,00	9.496,72	
3	ELEVAÇÃO											R\$ 647,47
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	56,40	11,48	11,48	0,00	11,48	-	647,47	0,00	647,47	R\$ -
									647,47	0,00	647,47	
4	COBERTURA											R\$ 44.940,20
4.1	Remoção, lavagem, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	86,98	412,50	206,25	0,00	412,50	-	35.879,25	0,00	35.879,25	R\$ -
4.2	Lona plástica preta	m²	6,46	412,50	206,25	0,00	412,50	-	2.664,75	0,00	2.664,75	R\$ -
4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,03	80,00	0,00	80,00	80,00	-	5.602,40	5.602,40	5.602,40	R\$ -
4.4	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	39,69	20,00	0,00	20,00	20,00	-	793,80	793,80	793,80	R\$ -
									44.940,20	6.396,20	44.940,20	
5	FORRO											R\$ 898,91
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	38,83	23,15	23,15	0,00	23,15	-	898,91	0,00	898,91	R\$ -
									898,91	0,00	898,91	
6	REVESTIMENTO											R\$ 14.364,32
6.1	PAREDE											R\$ 14.364,32
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4,24	42,52	42,52	0,00	42,52	-	180,28	0,00	180,28	R\$ 0,00
6.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	31,56	42,52	42,52	0,00	42,52	-	1.341,93	0,00	1.341,93	R\$ 0,00
6.1.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	m²	80,54	159,45	100,00	0,00	159,45	-	12.842,10	0,00	12.842,10	R\$ -

									14.364,32	0,00	14.364,32	
7	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 5.223,10
7.1	INTERNO											R\$ 5.223,10
7.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	61,03	84,00	84,00	0,00	84,00	-	5.126,52	0,00	5.126,52	R\$ -
7.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	48,29	2,00	2,00	0,00	2,00	-	96,58	0,00	96,58	R\$ -
									5.223,10	0,00	5.223,10	
8	ESQUADRIAS											R\$ 1.261,14
8.1	PORTAS											R\$ 1.261,14
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.155,71	1,00	1,00	0,00	1,00	-	1.155,71	0,00	1.155,71	R\$ -
8.1.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	105,43	1,00	1,00	0,00	1,00	-	105,43	0,00	105,43	R\$ -
									1.261,14	0,00	1.261,14	
9	PINTURA											R\$ 34.570,16
9.1	PAREDES											R\$ 25.984,01
9.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3,18	1144,59	572,29	0,00	1144,59	-	3.639,80	0,00	3.639,80	R\$ -
9.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,54	444,99	222,49	0,00	444,99	-	6.915,14	0,00	6.915,14	R\$ -
9.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,48	1144,59	572,29	0,00	1144,59	-	15.429,07	0,00	15.429,07	R\$ -
									25.984,01	0,00	25.984,01	
9.2	TETO											R\$ 7.281,99
9.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3,59	384,68	192,34	0,00	384,68	-	1.381,00	0,00	1.381,00	R\$ 0,00
9.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,34	384,68	192,34	0,00	384,68	-	5.900,99	0,00	5.900,99	R\$ 0,00
						0,00			7.281,99	0,00	7.281,99	
9.3	ESQUADRIAS											R\$ 1.304,16
9.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,09	36,96	36,96	0,00	36,96	-	557,73	0,00	557,73	R\$ 0,00
9.3.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m²	46,19	16,16	16,16	0,00	16,16	-	746,43	0,00	746,43	R\$ 0,00
									1.304,16	0,00	1.304,16	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 115.172,58	R\$ 6.991,50	R\$ 115.172,58	

Fábio Henrique da Silva Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA PB 181923107-7
 Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA PB 181923107-7

6,07% 100,00%
 Lúcio Flavio Araújo Costa
 Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

21/07/2023 À 28/08/2023

CONSTRUTORA: COSNTRUTORA EXECUTE LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA CRECHE TIA HILDA CARDOSO DE MORAES

PREGÃO PRESENCIAL: PP 0025/2023

ORDEM DE SERVIÇO: 008/2023



FOTO 01 - MANTA



FOTO 02 - MANTA

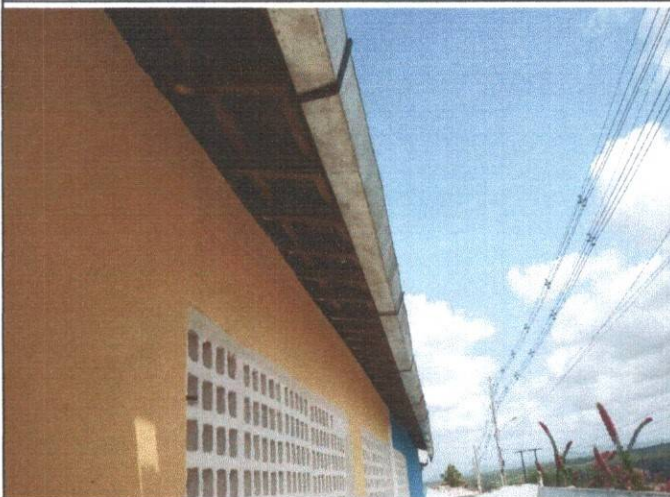


FOTO 03 - CALHA



FOTO 04 - CALHA



FOTO 05 - INTERTRAVADO



FOTO 06 - COBERTA

Fábio Henrique da Silva Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PB 161923107-7

maria Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA-PB Nº 1619551443
