



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ: 09.072.430/0001-93

OBRA – RECUPERAÇÃO DA ESCOLA Nª SRª DAS GRAÇAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

VALOR: R\$ 33.047,96

	EMPENHO
	LIQUIDAÇÃO
	NOTA FISCAL
	BOLETIM DE MEDIÇÃO
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
	MEMÓRIA DE CALCULO
	PAGAMENTO+ENCARGOS (INSS - ISS)
	CERTIDÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 09.072.430/0001-93

AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000

FONE: (8) -

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0005734	Data de Emissão: 09/10/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 287	Unidade Orçamentária: 0700 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC
--------------------------------	--

Classificação da Despesa: 12 - EDUCAÇÃO 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2002 - APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 1035 - CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0 - Sem CO definido 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 33.163,51 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 33.163,51 Este Empenho: 33.047,96 Saldo da Dotação: 115,55
--	--

Credor: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 48.768.125/0001-92
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.
--

Tipo de Meta: 4 - OBRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 33.047,96
----------------------------	-----------	---------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00025/2023	Modalidade: 11-Pregão Presencial
Contrato: 00124//2023	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra: 0030/2023	Categoria: 3 - RECUPERAÇÃO	Tipo: 5 - CRECHE	Data de Início: 30/06/2023
Fonte de Recurso: 5 - PRÓPRIOS E FEDERAIS			Data Prevista: 31/12/2023
Situação: 1 - EM ANDAMENTO			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 33.047,96 (Trinta e Três Mil, Quarenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 09/10/2023 LUCIO FLAVIO ARABJO COSTA	Deduzida da Dotação: em: 09/10/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



287

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA. Nº 430
CENTRO – ITABAIANA – PARAÍBA – CEP: 58.360-000
CNPJ: 09.072.430/0001-93

REQUERIMENTO DE DESPESA

DATA: 09/10/2023

ÓRGÃO SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB

IMPORTÂNCIA PEDIDA:

NOME DO CREDOR: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

ENDEREÇO: R Otacílio de Albuquerque, 22-Torre - João Pessoa-PB

CNPJ: 48.768.125/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviço

ESPECIFICAÇÃO DE DESPESA

IMPORTÂNCIA

Solicitamos autorização, após análise do Controle Interno, para empenho e liquidação da despesa no valor de R\$33.047,96 (Trinta e Três Mil e Quarenta e Sete Centavos e Noventa e Seis Centavos) referente aos serviços prestados na recuperação da ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, neste Município, referente a 3ª Medição, conforme o comprovante.

BANCO DO BRASIL

AG: 1234-3

CONTA: 68.501-1

IR: 198,28 ✓

ISS: 826,20 ✓

INSS: 1.817,63

V. LIQUIDO: 30.205,85

TOTAL: R\$ 33.047,96

R\$ 33.047,96

LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA	()	Nº
TOMADA DE PREÇO	()	Nº
CONVITE	()	Nº

**CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO:**

OBSERVAÇÕES:

PREGÃO: 0025/2023

CONTRATO: 00124/2023

GEO: 0030/2023

FONTE DE RECURSOS:

FUNDEB

AUTORIZO EMPENHAMENTO DE DESPESA:

SERVIÇO DE EMPENHAMENTO:

09.10.2023

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				NÚMERO 1000014
						CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TAAHYFGZF
DADOS BÁSICOS						
DATA DA EMISSÃO	DATA DA COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA	
09/10/2023	09/10/2023	Sim				
PRESTADOR DOS SERVIÇOS						
NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CNPJ		
CONSTRUTORA EXECUTE LTDA		EXECUTE CONSTRUÇÕES		48.768.125/0001-92		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI		
2379791	Exigível		Não	Não		
LOGRADOURO				NÚMERO		
RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE				00022		
COMPLEMENTO			BAIRRO			
SALA 02-CXPST 06:			TORRE			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
João Pessoa			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58040-720	(83) 99601-0048	conserte.contabil@gmail.com				
TOMADOR DOS SERVIÇOS						
NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		09.072.430/0001-93				
LOGRADOURO				NÚMERO		
AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA				422/430		
COMPLEMENTO			BAIRRO			
			CENTRO			
MUNICÍPIO			ESTADO		PAÍS	
Itabaiana			PB		BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL				
58360-000						
SERVIÇOS PRESTADOS						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS						
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
DESCRIÇÃO DETALHADA						
REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA Escola Nossa Senhora das Graças						
Total de serviço R\$33.047,96						
CNO DA OBRA: 90105.63406/75						
MATERIAIS APLICADOS 50% 16.523,98						
MAO DE OBRA APLICADA 50% 16.523,98						
RETENÇÕES:						
ISS 5% R\$ 826,19						
INSS 11% 1.817,63						
I.RENDA 1,2% R\$ 198,28						
VALOR LIQUIDO R\$ 30.205,86						
Agência 1234-3						
Conta 68.501-1						
BANCO DO BRASIL						
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA Atesto recebimento(s) do(s) material(ais) ou a execução do(s) serviço(s) de conformidade com a Nota Fiscal.  Félix Sebastião de Oliveira Secretário de Desenvolvimento Urbano e Controle Ambiental Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB Mat. 0112573						
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL						
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS ITABAIANA						
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS						
MUNICÍPIO		ESTADO				
Itabaiana		PB		BRASIL		
VALORES						
VALORES BÁSICOS						
PREÇO DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 33.047,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.523,98			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.817,63	R\$ 198,28	R\$ 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES						
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LIQUIDO		
R\$ 0,00	R\$ 16.523,98	5,00 %	R\$ 826,20	R\$ 30.205,85		
USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

09072430000193

AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000

FONE: (8) -

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

30.205,85

PAGUE-SE POR ESTE

CHEQUE A QUANTIA DE (TRINTA MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

A CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

OU À SUA ORDEM

ITABAIANA/PB, 01 de NOVEMBRO de 2023

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 0164-3	Operação:	Conta N°: 13796-0	N° do Documento CONSTRUT
Credor: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA				CNPJ/CPF: 48.768.125/0001-92
Endereço:		Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:		

Classificação da Despesa: 2 PREFEITURA MUNICIPAL 07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 2002 APRENDER, EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 1035 CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL/CRECHES 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 0 Sem CO definido 099 SEM SUBELEMENTO	Número Empenho: 0005734
	Data de Empenho: 09/10/2023
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 01/11/2023

Retenções: INSS I.R.R.F. - PES. JURIDICA I.S.S.	1.817,63 198,28 826,20
--	------------------------------

Valor Bruto: 33.047,96	Total das Deduções: 2.842,11	Valor Líquido: 30.205,85
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Recibo

Recebi a importância de R\$ 33.047,96 (Trinta e Três Mil, Quarenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

ITABAIANA/PB, 01 de NOVEMBRO de 2023

NÚMERO DO R.G.

CONSTRUTORA EXECUTE LTDA

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:58:23
016400164 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITABAIANA -FEB
AGENCIA: 0164-3 CONTA: 13.796-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.234.000.068.501
VALOR TOTAL	30.205,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA E LTDA
AGENCIA: 1234-3 CONTA: 68.501-1
NR. DOCUMENTO 550.164.000.013.796
=====

NR.AUTENTICACAO	D.BDD.5A2.CD6.781.68D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB510949 LUCIO FLAVIO ARAUJO COSTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

09072430000193

AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000

FONE: (8) -

GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - COMPETENCIA: 11/2023

Sequencia:	Documento:	Data:	Valor da Transferência:
0000003463	TRANSFER	01/11/2023	198,28

Orgão Responsável pela Transferência:

2 - Prefeitura Municipal

Conta Débito:

Órgão: 2 - Prefeitura Municipal
Código da Conta: 92
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 0164-3 - ITABAIANA
Operação:
Número: 12436-2
Título: BB I.R.R.F. - 12.436-2

Conta Crédito:

Órgão: 2 - Prefeitura Municipal
Código da Conta: 104
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 0164-3 - ITABAIANA
Operação:
Número: 13796-0
Título: BB FUNDEB - 13.796-0

Finalidade:

TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ DA NE 5734.

Tipo da Transferência:

Prefeito

Tesoureiro



Emissão de comprovantes

G3360114509841901
01/11/2023 15:00:06

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:58:23
016400164 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITABAIANA -FEB
AGENCIA: 0164-3 CONTA: 13.796-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.164.000.012.436
VALOR TOTAL	198,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN ITABAYANA IRRF	
AGENCIA: 0164-3	CONTA: 12.436-2
NR. DOCUMENTO	550.164.000.013.796
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.514.3E3.0AA.F3B.903



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

09072430000193

AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422 CENTRO ITABAIANA-PB CEP:58360-000

FONE: (8) -

GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - COMPETENCIA: 11/2023

Sequencia:	Documento:	Data:	Valor da Transferência:
0000003462	TRANSFER	01/11/2023	826,20

Órgão Responsável pela Transferência:

2 - Prefeitura Municipal

Conta Débito:

Órgão: 2 - Prefeitura Municipal
Código da Conta: 96
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 0164-3 - ITABAIANA
Operação:
Número: 12437-0
Título: BB I.S.S. - Impo s/Servi - 12.437-0

Conta Crédito:

Órgão: 2 - Prefeitura Municipal
Código da Conta: 104
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 0164-3 - ITABAIANA
Operação:
Número: 13796-0
Título: BB FUNDEB - 13.796-0

Finalidade:

TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DA NE 5734.

Tipo da Transferência:

Prefeito

Tesoureiro

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:58:23
016400164 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ITABAIANA -FEB
AGENCIA: 0164-3 CONTA: 13.796-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.164.000.012.437
VALOR TOTAL	826,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN ITABAIANA ISSQN
AGENCIA: 0164-3 CONTA: 12.437-0

NR. DOCUMENTO 550.164.000.013.796
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F97.ECF.20E.BF8.E68
-----------------	-----------------------

 ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 03				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 33.047,96				
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço: OS 009/2023				22/06/2023				
Medição: Boletim de Medição N° 01				Pregão de Presencial: PP 00025/2023								
Obra: RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS								Prazo da Obra: 120 dias				
Serviços Medidos: Pavimentação; Esquadrias; Pintura.								Prazo decorrido: 109 dias				
								Valor do contrato: R\$434.172,09				
								Valor Acumulado das Medições: R\$247.841,33				
Firma: COSNTRUTORA EXECUTE LTDA				Período: 12/09/2023		09/10/2023		Saldo do Contrato: R\$186.330,76				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total	
1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES											R\$ 55.459,75
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	50,45	17,56	17,56	0,00	17,56	-	885,90	0,00	885,90	R\$ -
1.2	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	15,28	350,00	350,00	0,00	350,00	-	5.348,00	0,00	5.348,00	R\$ -
1.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	7,73	2485,80	2485,80	0,00	2485,80	-	19.215,23	0,00	19.215,23	R\$ -
1.4	Remoção de pintura à óleo ou esmalte - Rev 01	m²	12,18	39,24	39,24	0,00	39,24	-	477,94	0,00	477,94	R\$ -
1.5	Demolição de reboco	m²	9,61	285,60	285,60	0,00	285,60	-	2.744,62	0,00	2.744,62	R\$ -
1.6	Demolição de piso de alta resistência	m²	21,81	420,00	420,00	0,00	420,00	-	9.160,20	0,00	9.160,20	R\$ -
1.7	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	28,38	485,23	485,23	0,00	485,23	-	13.770,83	0,00	13.770,83	R\$ -
1.8	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,43	97,45	97,45	0,00	97,45	-	431,70	0,00	431,70	R\$ -
1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,11	170,45	170,45	0,00	170,45	-	3.427,75	0,00	3.427,75	R\$ -
									55.459,75	0,00	55.459,75	
2	INFRAESTRUTURA											R\$ 12.955,61
2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	34,10	379,93	379,93	0,00	379,93	-	12.955,61	0,00	12.955,61	R\$ -
									12.955,61	0,00	12.955,61	
3	ELEVAÇÃO											R\$ 10.632,53
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	56,40	188,52	188,52	0,00	188,52	-	10.632,53	0,00	10.632,53	R\$ -
									10.632,53	0,00	10.632,53	
4	COBERTURA											R\$ 65.252,51
4.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	77,83	485,23	0,00	0,00	0,00	485,23	37.765,45	0,00	0,00	R\$ 37.765,45
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	39,84	485,23	0,00	0,00	0,00	485,23	19.331,56	0,00	0,00	R\$ 19.331,56
4.3	Lona plástica preta	m²	6,46	387,50	387,50	0,00	387,50	-	2.503,25	0,00	2.503,25	R\$ -
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	4.902,10	0,00	0,00	R\$ 4.902,10
4.5	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	39,69	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	750,14	0,00	0,00	R\$ 750,14
									65.252,51	0,00	2.503,25	
5	FORRO											R\$ 13.518,28
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	38,83	348,14	174,07	0,00	174,07	174,07	13.518,28	0,00	0,00	R\$ 13.518,28
									13.518,28	0,00	0,00	
6	REVESTIMENTO											R\$ 24.735,83
6.1	PAREDE											R\$ 24.735,83

6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4,24	307,48	307,48	0,00	307,48	-	1.303,72	0,00	1.303,72	R\$ -
6.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	31,56	307,48	307,48	0,00	307,48	-	9.704,07	0,00	9.704,07	R\$ -
6.1.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	m²	80,54	170,45	170,45	0,00	170,45	-	13.728,04	0,00	13.728,04	R\$ -
7	PAVIMENTAÇÃO								24.735,83	0,00	24.735,83	R\$ 84.388,26
7.1	INTERNO											R\$ 84.388,26
7.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	33,30	723,61	355,41	368,20	723,61	-	24.096,21	12.261,06	24.096,21	R\$ -
7.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	59,25	350,00	200,00	150,00	350,00	-	20.737,50	8.887,50	20.737,50	R\$ -
7.1.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL D DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	7,45	500,00	200,00	300,00	500,00	-	3.725,00	2.235,00	3.725,00	R\$ -
7.1.4	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022	m²	97,31	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	35.829,54	0,00	0,00	R\$ 35.829,54
8	ESQUADRIAS								84.388,26	23.383,56	48.558,71	R\$ 40.278,06
8.1	PORTAS											R\$ 27.392,32
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.155,71	2,00	2,00	0,00	2,00	-	2.311,42	0,00	2.311,42	R\$ -
8.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.253,33	10,00	10,00	0,00	10,00	-	12.533,30	0,00	12.533,30	R\$ -
8.1.3	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	1.254,76	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12.547,60	0,00	0,00	R\$ 12.547,60
8.2	JANELAS								27.392,32	0,00	14.844,72	R\$ 12.885,74
8.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	920,41	14,00	10,00	4,00	14,00	-	12.885,74	3.681,64	12.885,74	R\$ -
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								12.885,74	3.681,64	12.885,74	R\$ 19.796,84
9.1	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	UN	227,14	16,00	16,00	0,00	16,00	-	3.634,24	0,00	3.634,24	R\$ -
9.2	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	UN	310,94	25,00	25,00	0,00	25,00	-	7.773,50	0,00	7.773,50	R\$ -
9.3	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UN	310,18	20,00	20,00	0,00	20,00	-	6.203,60	0,00	6.203,60	R\$ -
9.4	LAMPADA DE LED 25W	UN	43,71	50,00	50,00	0,00	50,00	-	2.185,50	0,00	2.185,50	R\$ -
10	LOUÇAS E METAIS								19.796,84	0,00	19.796,84	R\$ 8.191,00

Fábio

Anália Cristina Gonçalves de C. I.
Engenheira Civil
CREA/PA 1619551-1

10.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	274,70	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1.922,90	0,00	0,00	R\$ 1.922,90
10.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	557,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3.899,00	0,00	0,00	R\$ 3.899,00
10.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	394,85	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.369,10	0,00	0,00	R\$ 2.369,10
									8.191,00	0,00	0,00	
11	PINTURA											R\$ 98.963,43
11.1	PAREDES											R\$ 80.042,76
11.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3,18	2485,80	800,00	185,80	985,80	1.500,00	7.904,84	590,84	3.134,84	R\$ 4.770,00
11.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,54	2485,80	800,00	185,80	985,80	1.500,00	38.629,33	2.887,33	15.319,33	R\$ 23.310,00
11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,48	2485,80	800,00	185,80	985,80	1.500,00	33.508,58	2.504,58	13.288,58	R\$ 20.220,00
									80.042,76	5.982,76	31.742,76	
11.2	TETO											R\$ 15.923,01
11.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3,59	115,32	115,32	0,00	115,32	-	414,00	0,00	414,00	R\$ -
11.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	27,48	500,00	174,07	0,00	174,07	325,93	13.740,00	0,00	4.783,44	R\$ 8.956,56
11.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15,34	115,32	115,32	0,00	115,32	-	1.769,01	0,00	1.769,01	R\$ -
									15.923,01	0,00	6.966,45	
11.3	ESQUADRIAS											R\$ 2.997,66
11.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,09	78,54	0,00	0,00	0,00	15,09	1.185,17	0,00	0,00	R\$ 1.185,17
11.3.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	m²	46,19	39,24	0,00	0,00	0,00	46,19	1.812,50	0,00	0,00	R\$ 1.812,50
									2.997,66	0,00	0,00	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 434.172,087	R\$ 33.047,96	R\$ 241.082,19	

7,61% 55,53%

Fabio Henrique de Siqueira Barbosa
Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 161.955,1-1

Lúcio/Flávio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02

12/09/2023 À 09/10/2023

CONSTRUTORA: COSNTRUTORA EXECUTE LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

PREGÃO PRESENCIAL: PP 0025/2023

ORDEM DE SERVIÇO: 009/2023



FOTO 01 - PLACA DE OBRA

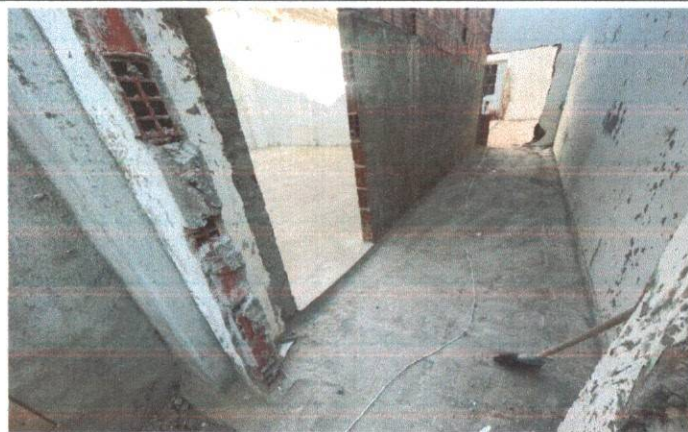


FOTO 02 - CONTRAPISO

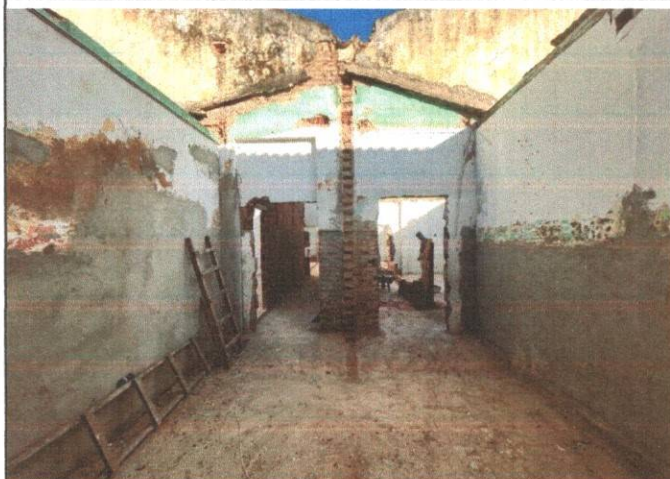


FOTO 03 - CONTRAPISO



FOTO 04 - PISO



FOTO 05 - PINTURA ALVENARIA



FOTO 06 - ~~ALVENARIA~~
 Maria Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA-PB Nº 161955-1/13

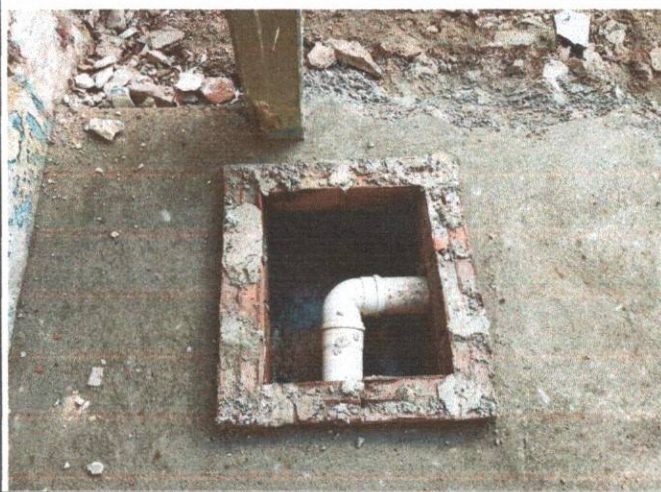


FOTO 07 - PISO

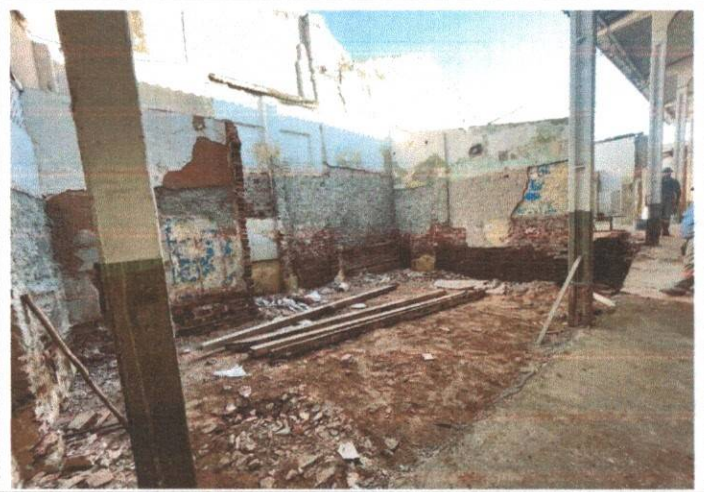


FOTO 08 - DEMOLIÇÃO

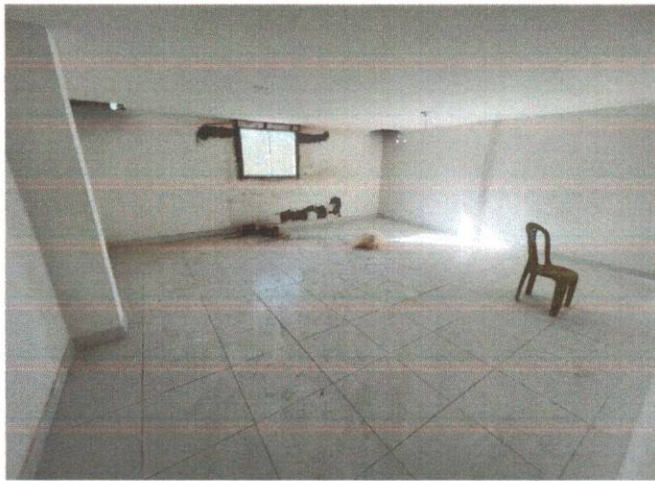


FOTO 07 - GESSO E JANELA



FOTO 08 - GESSO

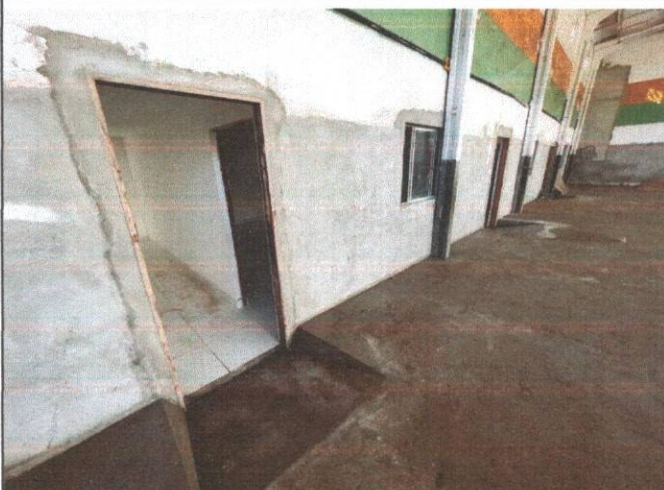


FOTO 07 - CONTRAPISO



FOTO 08 - CONTRAPISO

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB 161952-1/13

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.768.125/0001-92
Razão Social: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA
Endereço: R OTACILIO DE ALBUQUERQUE 22 SALA 02 CXP 06 / TORRE / JOAO
PESSOA / PB / 58040-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/09/2023 a 23/10/2023

Certificação Número: 2023092404571908123887

Informação obtida em 04/10/2023 11:16:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA
CNPJ: 48.768.125/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:53:11 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2024.

Código de controle da certidão: **8744.F692.F328.0C32**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **E793.1ADF.1874.E85A**

Emitida no dia 21/08/2023 às 11:17:09

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **48.768.125/0001-92**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa**. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 21/08/2023
Hora: 11:15

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2023/092122

Nº de Controle de Autenticação

558.395.561.546

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 48768125000192		Nome do Contribuinte CONSTRUTORA EXECUTE LTDA			
Endereço RUA OTACILIO DE ALBUQUERQUE		Número 00022	Apto/Sala 	Bloco 	Complemento SALA 02;CXPST 06;
Bairro TORRE	CEP 58040720	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 237979-1

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente em 21/08/2023 11:15:18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA EXECUTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.768.125/0001-92

Certidão n°: 53931299/2023

Expedição: 04/10/2023, às 11:19:03

Validade: 01/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA EXECUTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.768.125/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.
